

CORREDOR: [E-18] Abejorral - Santa Bárbara - El Cairo - La Elvira

Subregión: Oriente | Lote: Lote 1 - Subregión Oriente | Estado: EN EJECUCIÓN

Contrato de Obra No.: 20260202 (CONSORCIO ANTIOQUIA ORIENTE) | Interventoría No.: 20260210 (CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA)

Plazo Contractual: 13 Meses (323 días calendario)

Acta Inicio: 01/06/2026 · Estabilización: 26/08/2026 · Vencimiento: 20/04/2027

Tiempo Transcurrido: 123 de 323 días (38.1%) · Faltante: 200 días (61.9%)

ALCANCE FÍSICO (KM)

9.72 km probables

De 23.77 km contratados (40,9%)

ADICIÓN REQUERIDA

+ \$ 28.861 M

+144,5% sobre vlr. contractual

AVANCE FÍSICO ACTUAL

2,58% (Sem 17)

Prog: 3,85% · Brecha: -1,27%

DRENAJE Y FILTROS

1.164 ml Filtros MI

11 de 22 Alcantarillas (48,9%)

RITMO REQUERIDO

3,36% / semana

29 sem restantes · Fin: 20/04/2027

DIAGRAMA VECTORIAL DE PROGRESIÓN POR ABSISAS Y DISCIPLINAS DE OBRA

Sector evaluado: K 0+000 a K 23.770 | Inspección activa: K 1+150 | Georreferenciación 100% Vectorial

CALZADA PRINCIPAL

Eje vial y tráfico

CONTROL DE ABCISAS

Kilometraje continuo

OBRAS PUNTUALES

22 Alcantarillas

DRENAJE LINEAL


Cunetas y Filtros (MI/MD)

ESTRUCTURA

TSD / MGTC / Cal

CAMPO & CONTROL

Topografía & Apiques

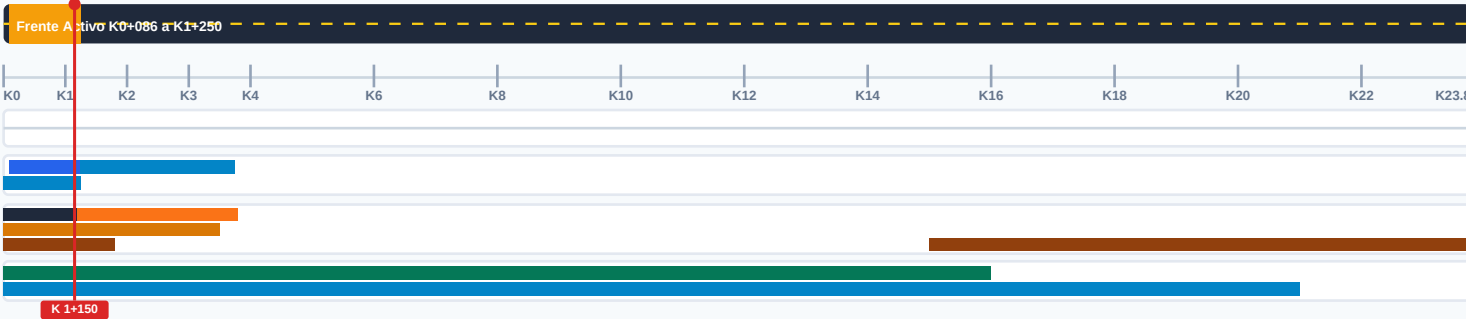

0 – 23.8 km

K 1 + 150

48,9% (11/22)


1.164 ml (4,1%)

2,58% Físico

88,4% Apiques

CURVA S CONTRACTUAL & CONTROL SEMANAL (SEM 1 A 46)

Corte Actual: Sem 17 (24/09/2026) · Prog: 3,85% vs Real: 2,58% · Meta: Sem 46 (20/04/2027)

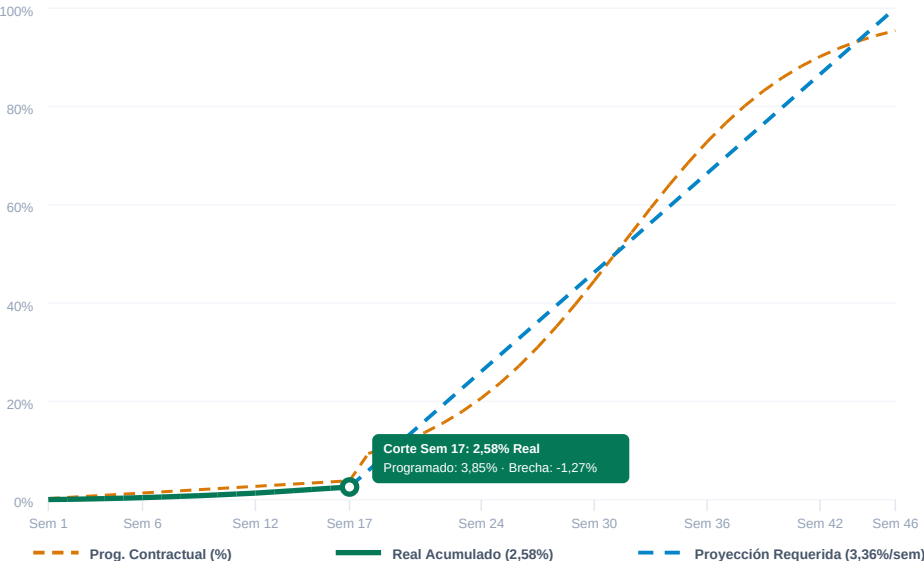

BALANCE CONTRACTUAL VS PROYECTADO POR ACTIVIDAD

Cifras oficiales en Millones de Pesos (M) y Variación Presupuestal

Actividad Técnica	Contractual	Proyectado	Variación (\$)	Var (%)
Construcción alcantarilla	\$ 349.1 M	\$ 4569.7 M	+\$ 4220.6 M	+1208.9%
Construcción cuneta	\$ 3962.9 M	\$ 5209.2 M	+\$ 1246.3 M	+31.4%
Construcción filtro	\$ 4154.3 M	\$ 4853.5 M	+\$ 699.2 M	+16.8%
Construcción bordillos	\$ 587.9 M	\$ 31.6 M	\$ -556.3 M	-94.6%
Construcción disipadores	\$ 24.2 M	\$ 423.7 M	+\$ 399.6 M	+1654.4%
Estabilización (Cal / Cemento)	\$ 10535.1 M	\$ 32124.4 M	+\$ 21589.4 M	+204.9%
Señalización vial	\$ 355.9 M	\$ 417.2 M	+\$ 61.3 M	+17.2%
MDC-19 (Mezcla en caliente)	\$ 0.0 M	\$ 1200.6 M	+\$ 1200.6 M	+100.0%
TOTAL GENERAL	\$ 19969.2 M	\$ 48829.8 M	+\$ 28860.6 M	+144.5%

AUDITORÍA CRONOLÓGICA DE EJECUCIÓN SEMANAL (SEMANAS 1 A 46)

Control periódico de cumplimiento de metas físicas por semana calendario

Sem	Periodo	Estado	Prog.	Real	Delta	Acum.	Hito Técnico Principal
Sem 01	01/06 - 07/06	Cerrada	0.09%	0.03%	-0.06%	0.03%	Acta de inicio y comisiones topográficas K0 a K2.
Sem 02	08/06 - 14/06	Cerrada	0.10%	0.07%	-0.03%	0.10%	Topografía de precisión y nivelación geométrica K2 a K4.
Sem 03	15/06 - 21/06	Cerrada	0.12%	0.10%	-0.02%	0.20%	Inicio de apiques geomecánicos CBR K0 a K3.
Sem 04	22/06 - 28/06	Cerrada	0.14%	0.13%	-0.01%	0.33%	Ensayos de laboratorio (Límites, Proctor) K3 a K7.
Sem 05	29/06 - 05/07	Cerrada	0.16%	0.13%	-0.03%	0.46%	Topografía de detalle en curvas críticas K7 a K10.
Sem 06	06/07 - 12/07	Cerrada	0.17%	0.14%	-0.03%	0.60%	Diseño de mezcla de estabilización con cal y cemento.
Sem 07	13/07 - 19/07	Cerrada	0.19%	0.14%	-0.05%	0.74%	Inventario de 22 alcantarillas y localización de fuentes.
Sem 08	20/07 - 26/07	Cerrada	0.21%	0.15%	-0.06%	0.89%	Topografía sector K10 a K13 y coordinación predial.
Sem 09	27/07 - 02/08	Cerrada	0.23%	0.13%	-0.10%	1.02%	Demolición controlada y limpieza cabezotes K 0+150.
Sem 10	03/08 - 09/08	Cerrada	0.25%	0.15%	-0.10%	1.17%	Instalación de tubería de concreto 36 pulg. K 0+150.
Sem 11	10/08 - 16/08	Cerrada	0.26%	0.14%	-0.12%	1.31%	Excavación mecánica de zanja para filtro en K 0+086 MI.
Sem 12	17/08 - 23/08	Cerrada	0.28%	0.10%	-0.18%	1.41%	Movilización de tren de estabilización y fresadora.
Sem 13	24/08 - 30/08	Cerrada	0.30%	0.17%	-0.13%	1.58%	INICIO ESTABILIZACIÓN: Tramo prueba cal K 0 a K 0+400.
Sem 14	31/08 - 06/09	Cerrada	0.32%	0.19%	-0.13%	1.77%	Subrasante con cal K 0+400 a K 1+200 y filtro MI.
Sem 15	07/09 - 13/09	Cerrada	0.34%	0.22%	-0.12%	1.99%	Geotextil y tubería perforada filtro K 0+600 a K 0+950.
Sem 16	14/09 - 20/09	Cerrada	0.35%	0.26%	-0.09%	2.25%	Base MGTC 20-28 cm K 0+000 a K 0+800 y densidad.
Sem 17	21/09 - 27/09	CORTE OFICIAL	0.37%	0.33%	-0.04%	2.58%	CORTE OFICIAL: Filtro MI 1.164 ml y TSD 1.2 km concluidos.
Sem 18	28/09 - 04/10	Proy.	1.85%	—	—	4.43%	Proyectada: Apertura 2º frente K 1+200 a K 3+500.
Sem 25	16/11 - 22/11	Proy.	3.50%	—	—	28.9%	Proyectada: Ritmo intensivo de estabilización cal/cemento.
Sem 35	25/01 - 31/01	Proy.	4.20%	—	—	68.5%	Proyectada: Pavimentación TSD y MDC-19 en sectores críticos.
Sem 46	14/04 - 20/04	Proy.	2.10%	—	—	100.0%	META CONTRACTUAL: Entrega final de 23,77 km estabilizados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO OFICIAL GEORREFERENCIADO

Interventoría Contrato 20260210 · Evidencia de campo en el corredor

1. Cuadrilla de Topografía y Levantamiento

PR 24+940

Categoría: Topografía | Fecha: 23/09/2026 3:54 PM

Coordenadas GPS: 5.812645°N, 75.420453°W | Fuente: Interventoría CAAS / Rentan

Comisión de topografía con estación total y cuadrilla con chalecos institucionales en el sector de Abejorral.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CERTIFICADA EN EXPEDIENTE DE INTERVENTORÍA

2. Instalación de Subdren y Filtro Longitudinal

PR 25+320

Categoría: Filtros Drenantes | Fecha: 22/09/2026 8:57 AM

Coordenadas GPS: 5.814333°N, 75.422450°W | Fuente: Interventoría CAAS / Rentan

Colocación de geotextil no tejido, tubería perforada y material granular filtrante en zanja lateral.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CERTIFICADA EN EXPEDIENTE DE INTERVENTORÍA

3. Valla Reglamentaria y Acopio de Material

PR 25+490

Categoría: Señalización | Fecha: 22/09/2026 9:15 AM

Coordenadas GPS: 5.815120°N, 75.423980°W | Fuente: Interventoría CAAS / Rentan

Valla institucional de obra Gobernación de Antioquia y zona de acopio de materiales pétreos seleccionados.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CERTIFICADA EN EXPEDIENTE DE INTERVENTORÍA

4. Frente de Estabilización con Maquinaria

PR 25+650

Categoría: Estabilización | Fecha: 23/09/2026 11:20 AM

Coordenadas GPS: 5.816045°N, 75.425120°W | Fuente: Interventoría CAAS / Rentan

Distribución y mezclado de estabilizante químico/cemento con motoniveladora y tren de compactación vibratoria.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CERTIFICADA EN EXPEDIENTE DE INTERVENTORÍA
