

Programa de Estabilización de vías en el Departamento de Antioquia

Informe de variación de alcances por corredor · Septiembre de 2026



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Abejorral – Santa Bárbara – El Cairo – La Elvira

Longitud contractual

23,77 km

Longitud probable a cubrir

9,72 km

Valor por km contractual

\$ 840.100.338

Valor por km proyectado

\$ 2.054.261.084

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 28.860.600.924

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Abejorral – Santa Bárbara – El Cairo – La Elvira

LOTE 1 · Longitud: 23.770 m
Tránsito – Estructuración: 307.000
Tránsito – Diseño: 311.553

Teórica

TSD

Estabilización con cemento

Subbase 13 cm

Subrasante estabilizada con cal

28 cm

20 cm

Espesor: 48 cm

Aprobada (MDC-19)

MDC-19

Estabilización con cemento (MGTC)

Afirmado

7,5 cm

20 cm

25 cm

Espesor: 52,5 cm

Aprobada (TSD)

TSD

Estabilización con cemento (MGTC)

Afirmado

39 cm

25 cm

Espesor: 64 cm

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)		% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 349.118.827	1,7 %	\$ 4.569.689.585	9,4 %	▲	\$ 4.220.570.758	1208,9 %
Construcción cuneta	\$ 3.962.861.757	19,8 %	\$ 5.209.150.329	10,7 %	▲	\$ 1.246.288.572	31,4 %
Construcción filtro	\$ 4.154.277.100	20,8 %	\$ 4.853.456.980	9,9 %	▲	\$ 699.179.880	16,8 %
Construcción bordillos	\$ 587.858.975	2,9 %	\$ 31.606.724	0,1 %	▼	-\$ 556.252.251	-94,6 %
Construcción disipadores	\$ 24.152.373	0,1 %	\$ 423.717.387	0,9 %	▲	\$ 399.565.014	1654,4 %
Estabilización	\$ 10.535.064.588	52,8 %	\$ 32.124.443.827	65,8 %	▲	\$ 21.589.379.239	204,9 %
Señalización vial	\$ 355.851.420	1,8 %	\$ 417.158.664	0,9 %	▲	\$ 61.307.244	17,2 %
MDC	\$ –	0,0 %	\$ 1.200.562.468	2,5 %	▲	\$ 1.200.562.468	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 19.969.185.040	100%	\$ 48.829.785.964	100%	▲	+\$ 28.860.600.924	144,5 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

- Se tiene cuatro estructuras aprobadas, para diferentes tramos, de acuerdo con CBR encontrados ((1,2 – 38,6) y pendientes longitudinales de la vía; en las zonas de altas pendientes (>8%) se utiliza MDC-19 para la carpeta.

Abejorral – Santa Bárbara – El Cairo – La Elvira

Longitud

23,77 km

Alcance real 16,87 km · dif. 6,90 km

Valor total del corredor

\$ 20.453.866.674

\$ 860.490.815 por km

Avance físico

2,58 %

Frente a 38,1 % del plazo

Avance financiero

3,40 %


Plazo transcurrido

38,1 %


4 de 10,6 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **01/06/2026**
Terminación: **20/04/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

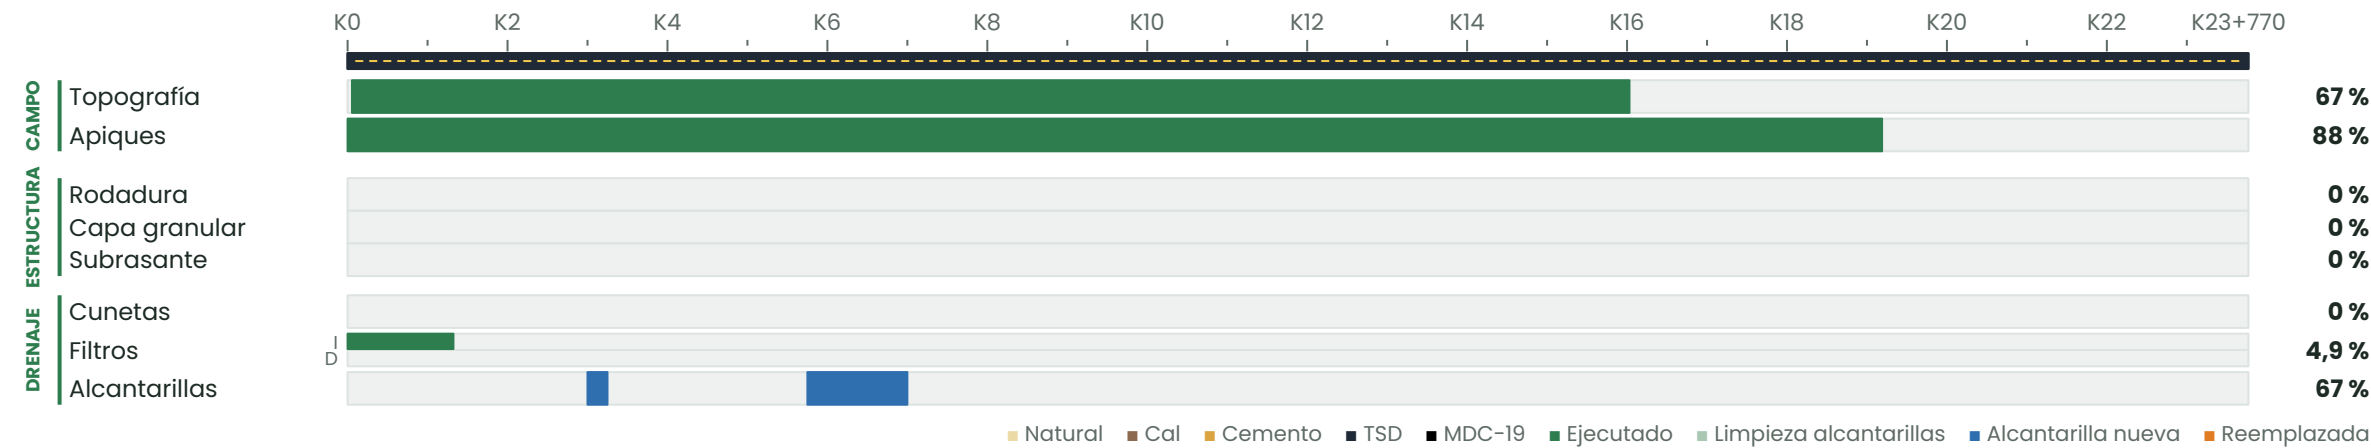

AVANCE POR ACTIVIDAD

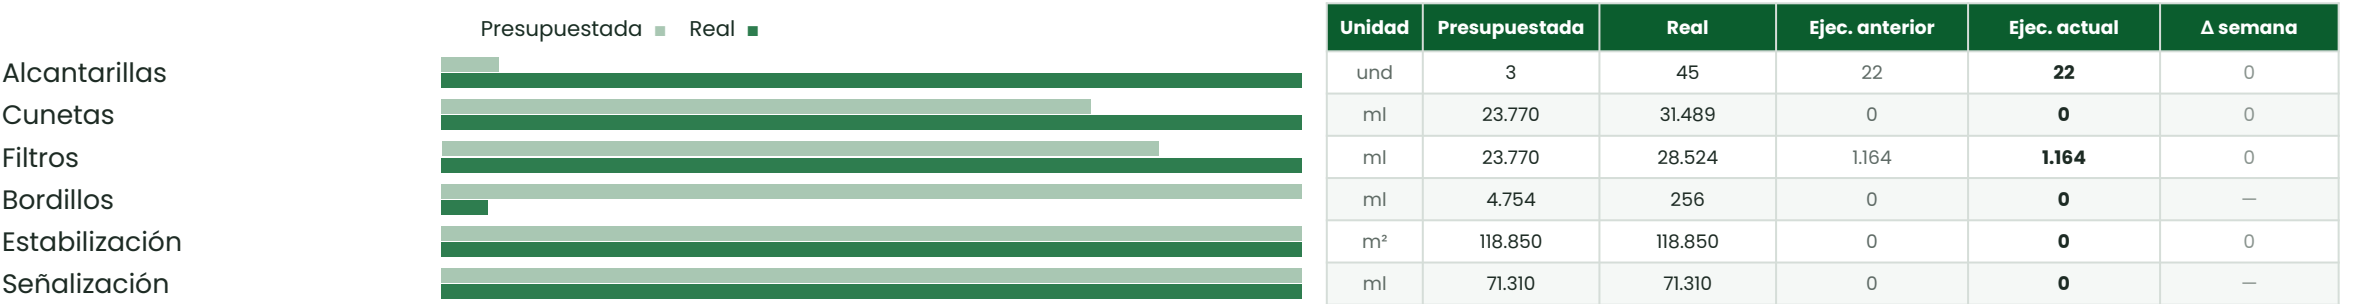

La Frontera (Ruta 56) – Mesopotamia – Abejorral

Longitud contractual

25,49 km

Longitud probable a cubrir

12,35 km

Valor por km contractual

\$ 905.079.861

Valor por km proyectado

\$ 1.868.602.592


Variación total (valor adicional)

▲ \$ 24.560.194.406

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

La Frontera (Ruta 56) – Mesopotamia – Abejorral

LOTE 1 · Longitud: 25.490 m
Tránsito – Estructuración: 307.000
Tránsito – Diseño: 265.965

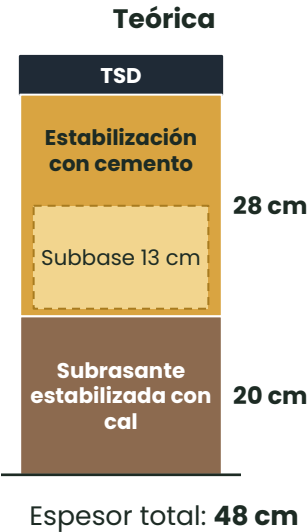

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)		% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 2.244.351.844	9,7 %	\$ 2.852.204.289	6,0 %	▲	\$ 607.852.445	27,1 %
Construcción cuneta	\$ 4.212.009.351	18,3 %	\$ 5.518.986.339	11,6 %	▲	\$ 1.306.976.988	31,0 %
Construcción filtro	\$ 4.325.107.514	18,7 %	\$ 4.313.471.524	9,1 %	▼	-\$ 11.635.990	-0,3 %
Construcción bordillos	\$ 630.437.534	2,7 %	\$ 52.976.848	0,1 %	▼	-\$ 577.460.686	-91,6 %
Construcción disipadores	\$ 322.236.492	1,4 %	\$ 497.142.581	1,0 %	▲	\$ 174.906.089	54,3 %
Estabilización	\$ 10.958.008.114	47,5 %	\$ 32.233.891.864	67,7 %	▲	\$ 21.275.883.750	194,2 %
Señalización vial	\$ 378.334.810	1,6 %	\$ 563.351.431	1,2 %	▲	\$ 185.016.621	48,9 %
MDC	\$ –	0,0 %	\$ 1.598.655.189	3,4 %	▲	\$ 1.598.655.189	–
TOTAL CORREDOR	\$ 23.070.485.659	100%	\$ 47.630.680.065	100%	▲	+\$ 24.560.194.406	106,5 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

La Frontera (Ruta 56) – Mesopotamia – Abejorral

Longitud
25,49 km
Alcance real 18,26 km · dif. 7,23 km

Valor total del corredor
\$ 23.586.495.590
\$ 925.323.484 por km


Avance físico
0,55 %
Frente a 38,1 % del plazo

Avance financiero
0,63 %


Plazo transcurrido
38,1 %
4 de 10,6 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **01/06/2026**
Terminación: **20/04/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISCA

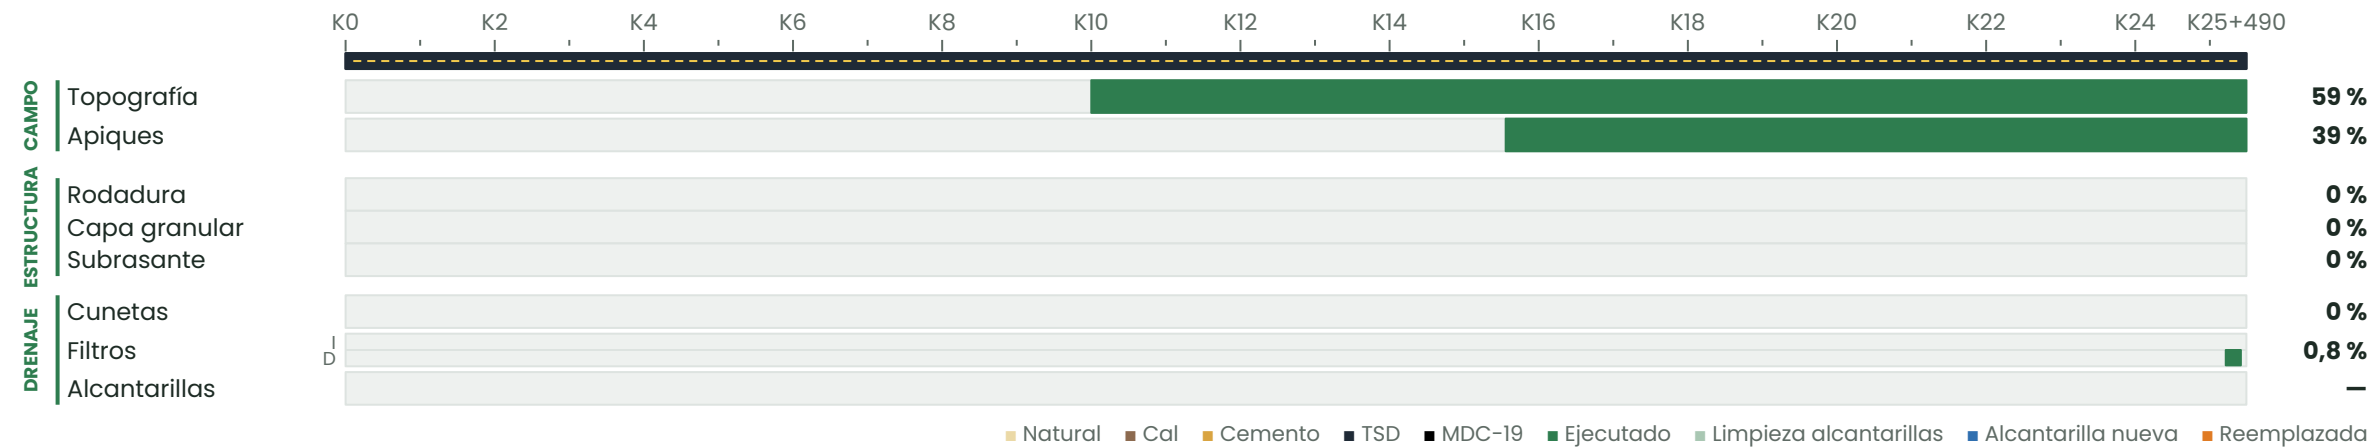

AVANCE POR ACTIVIDAD

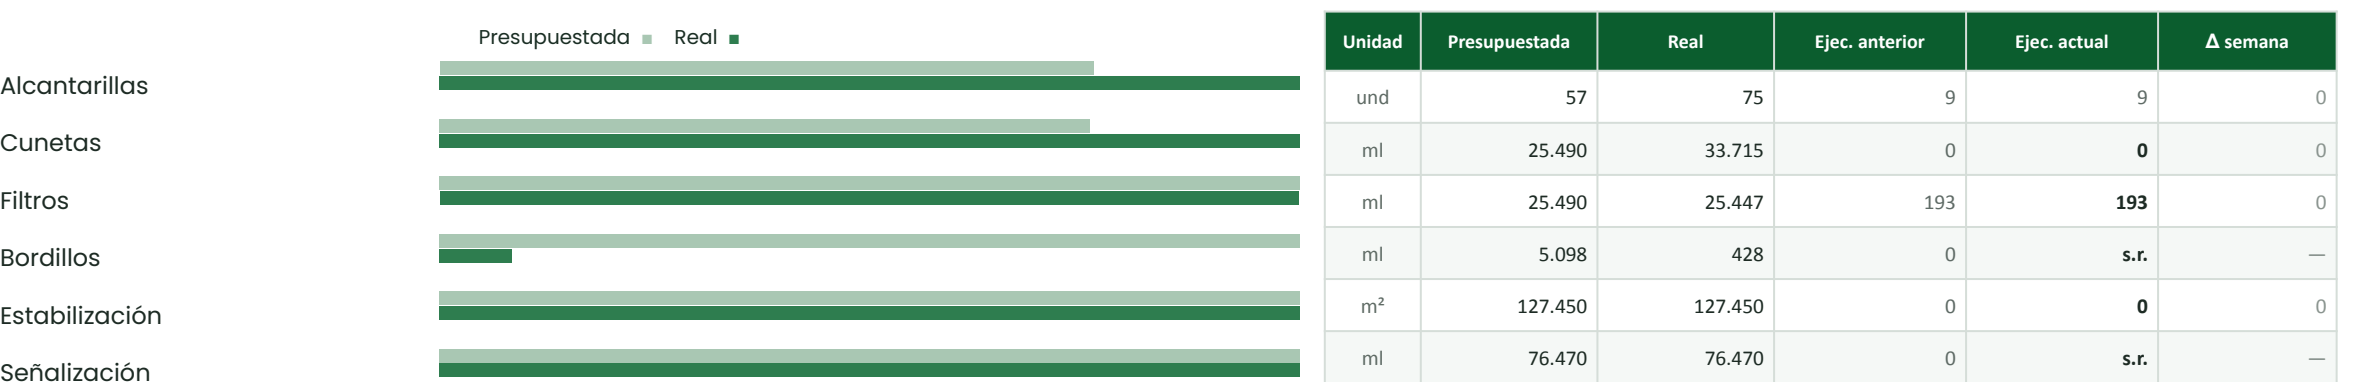

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



San Vicente – El Peñol

Longitud contractual

18,15 km

Longitud probable a cubrir

12,70 km

Valor por km contractual

\$ 972.274.441

Valor por km proyectado

\$ 1.325.235.279

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 6.406.239.200

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

San Vicente – El Peñol

LOTE 1 · Longitud: 18.150 m
Tránsito – Estructuración: 307.000
Tránsito – Diseño: 305.611



Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)	% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 2.107.061.362	11,94%	\$ 2.104.063.900	8,75%	▼ –\$ 2.997.462	–0,1 %
Construcción cuneta	\$ 3.097.519.177	17,55%	\$ 3.388.939.783	14,09%	▲ \$ 291.420.606	9,4 %
Construcción filtro	\$ 3.280.173.270	18,59%	\$ 2.637.466.000	10,97%	▼ –\$ 642.707.270	–19,6 %
Construcción bordillos	\$ 466.105.520	2,64%	\$ 866.821.200	3,60%	▲ \$ 400.715.680	86,0 %
Construcción disipadores	\$ 342.721.665	1,94%	\$ 342.721.665	1,42%	\$ 0	0,0 %
Estabilización	\$ 8.072.574.897	45,75%	\$ 14.491.765.743	60,25%	▲ \$ 6.419.190.846	79,5 %
Señalización vial	\$ 280.625.220	1,59%	\$ 221.242.020	0,92%	▼ –\$ 59.383.200	–21,2 %
TOTAL CORREDOR	\$ 17.646.781.111	100%	\$ 24.053.020.311	100%	▲ +\$ 6.406.239.200	36,3 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

- El alcance se reduce de 18,15 km a 12,75 km, descontando **5,40 km** de pavimento existente.

San Vicente – El Peñol

Longitud
18,15 km
Alcance real 12,70 km · dif. 5,45 km

Valor total del corredor
\$ 17.646.781.111
\$ 972.274.441 por km


Avance físico
Sin dato
Pendiente de reporte

Avance financiero
Sin dato


Plazo transcurrido
38,1 %
4 de 10,6 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **01/06/2026**
Terminación: **20/04/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

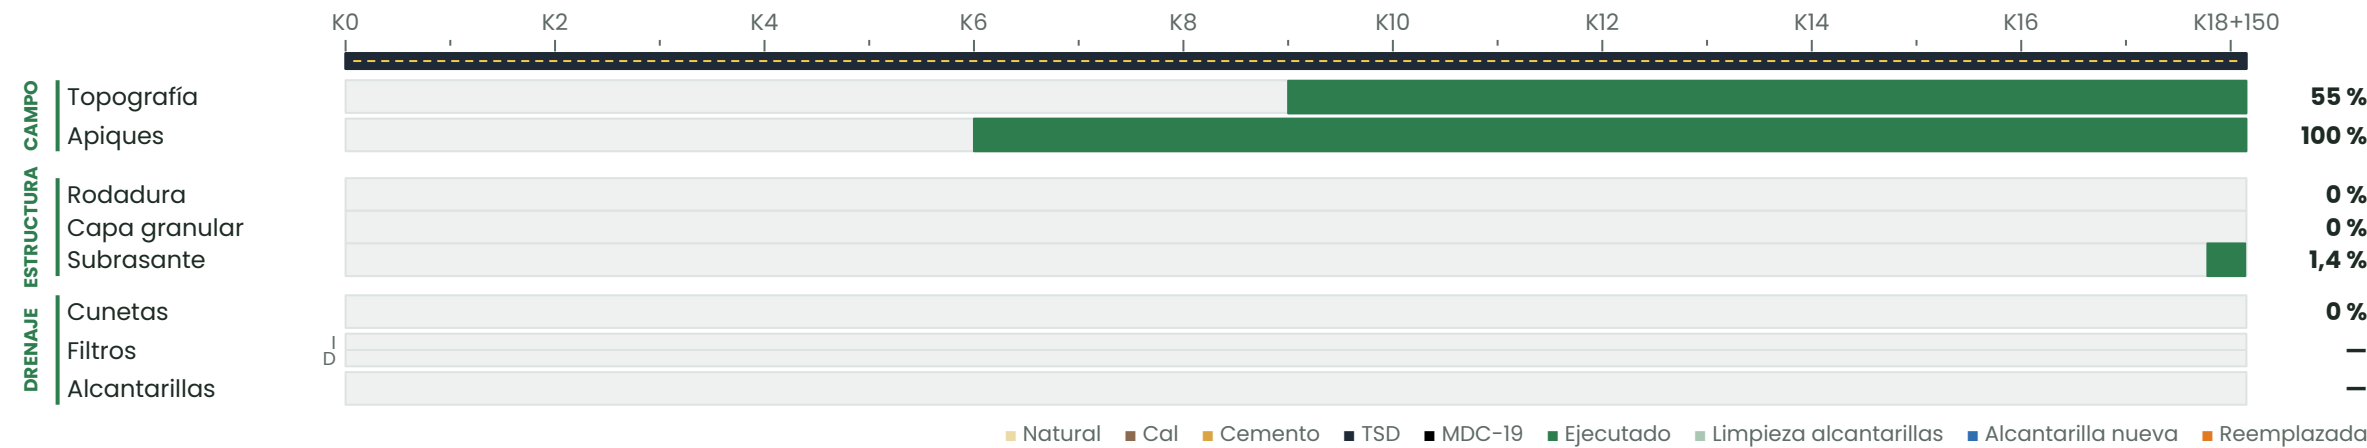

AVANCE POR ACTIVIDAD

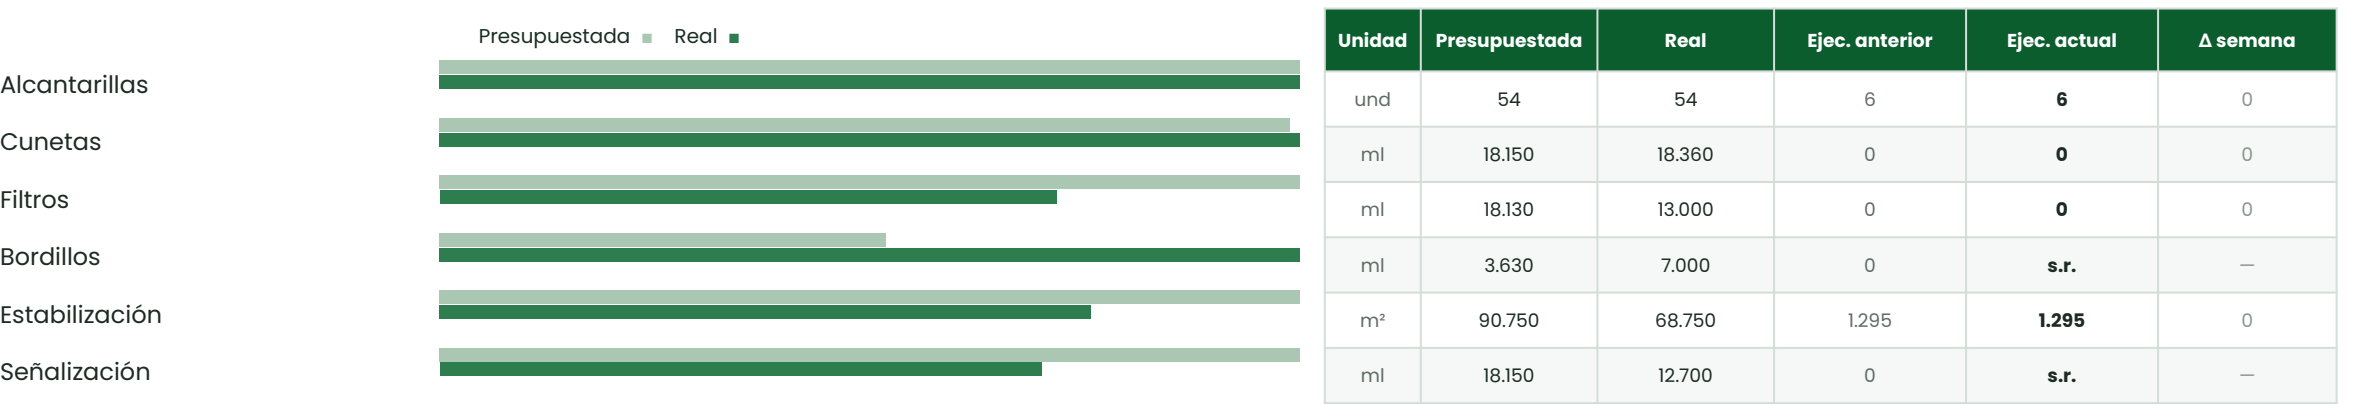

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Consolidado Lote 1 – Oriente

Km contratados

99,22 km

7 corredores

Km que se alcanzan

53,04 km

Cobertura 52,1 % del valor proyectado

Valor contractual

\$ 95.269.158.634

\$ 960.180.998 por km

Valor proyectado

\$ 182.803.527.436

\$ 1.842.406.041 por km

Adición estimada

▲ \$ 87.534.368.802

+91,9 % sobre lo contractual

Corredor	Longitud (km)	Valor contractual	\$/km contractual	Valor proyectado	\$/km proyectado	Longitud probable (km)	Variación (valor adicional)	% variación	Cobertura
Abejorral – Santa Bárbara – El Cairo – La Elvira	23,77	\$ 19.969.185.040	\$ 840.100.338	\$ 48.829.785.964	\$ 2.054.261.084	9,72	▲ \$ 28.860.600.924	144,5 %	40,9 %
La Frontera (Ruta 56) – Mesopotamia – Abejorral	25,49	\$ 23.070.485.659	\$ 905.079.861	\$ 47.630.680.065	\$ 1.868.602.592	12,35	▲ \$ 24.560.194.406	106,5 %	48,4 %
San Vicente – El Peñol	18,15	\$ 17.646.781.111	\$ 972.274.441	\$ 24.053.020.311	\$ 1.325.235.279	13,32	▲ \$ 6.406.239.200	36,3 %	73,4 %
SUBTOTAL CORREDORES CON PROYECCIÓN	67,41	\$ 60.686.451.810	\$ 900.258.891	\$ 120.513.486.340	\$ 1.787.768.674	35,38	▲ \$ 59.827.034.530	98,6 %	50,4 %
San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría *	2,26	\$ 2.707.438.687	\$ 1.197.981.720	\$ 4.425.510.622	\$ 1.958.190.541	1,38	▲ \$ 1.718.071.935	63,5 %	61,2 %
La Quiebra – Santa Ana *	5,33	\$ 6.342.396.909	\$ 1.189.943.135	\$ 10.437.155.581	\$ 1.958.190.541	3,24	▲ \$ 4.094.758.672	64,6 %	60,8 %
Sonsón – Aguadas (Puente San Rafael) *	19,22	\$ 20.422.716.723	\$ 1.062.576.312	\$ 37.636.422.190	\$ 1.958.190.541	10,43	▲ \$ 17.213.705.467	84,3 %	54,3 %
Guarne – Yolombal *	5,00	\$ 5.110.154.505	\$ 1.022.030.901	\$ 9.790.952.703	\$ 1.958.190.541	2,61	▲ \$ 4.680.798.198	91,6 %	52,2 %
TOTAL LOTE	99,22	\$ 95.269.158.634	\$ 960.180.998	\$ 182.803.527.436	\$ 1.842.406.041	53,04	▲ \$ 87.534.368.802	91,9 %	52,1 %

Valor contractual según presupuesto del oferente; valor proyectado estimado con el promedio del valor por km proyectado de Abejorral–Santa Bárbara–El Cairo–La Elvira y La Frontera–Mesopotamia–Abejorral, excluyendo San Vicente–El Peñol (\$ 1.958.190.541).

Valor total del contrato \$ 103.221.085.667 · Valor contractual de obra \$ 95.269.158.634 · Valores reembolsables \$ 7.951.927.033.

Longitud probable = longitud × valor contractual ÷ valor proyectado · Cobertura = valor contractual ÷ valor proyectado.

KILÓMETROS DEL LOTE QUE SE CUBREN CON EL VALOR CONTRACTUAL

53,04 km · 53,5 % se alcanza

46,18 km · 46,5 % pendiente

Miserenga – Ebéjico

Longitud contractual

1,00 km

Longitud probable a cubrir

0,81 km

Valor por km contractual

\$ 1.244.564.034

Valor por km proyectado

\$ 1.539.355.914

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 294.791.880

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Miserenga – Ebéjico

LOTE 2 · Longitud: 1.000 m

Tránsito – Estructuración: 307.000

Tránsito – Diseño: 1.123.751

Teórica

TSD

Estabilización con cemento

Subbase 13 cm

Subrasante estabilizada con cal

28 cm

20 cm

Espesor total: 48 cm

Aprobada

MDC-19

BGTC

11 cm

28 cm

Espesor total: 39 cm

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)	% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 361.776.290	29%	\$ 36.901.785	2%	▼ -\$ 324.874.505	-89,8 %
Construcción cuneta	\$ 156.594.148	13%	\$ 170.528.373	11%	▲ \$ 13.934.225	8,9 %
Construcción filtro	\$ 161.153.080	13%	\$ 151.661.752	10%	▼ -\$ 9.491.328	-5,9 %
Construcción bordillos	\$ 24.366.012	2%	\$ –	0%	▼ -\$ 24.366.012	-100,0 %
Construcción disipadores	\$ 61.862.380	5%	\$ –	0%	▼ -\$ 61.862.380	-100,0 %
Estabilización	\$ 464.103.369	37%	\$ 132.568.320	9%	▼ -\$ 331.535.049	-71,4 %
Señalización vial	\$ 14.708.755	1%	\$ 11.259.755	1%	▼ -\$ 3.449.000	-23,4 %
Obras no previstas (realces, MDC-19)	\$ –	0%	\$ 1.036.435.929	67%	▲ \$ 1.036.435.929	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 1.244.564.034	100%	\$ 1.539.355.914	100%	▲ +\$ 294.791.880	23,7 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Cambio de estructura de pavimento de TSD a MDC19

Miserenga – Ebéjico

Longitud
1,00 km
Alcance real 0,81 km · dif. 0,19 km

Valor total del corredor
\$ 1.244.564.034
\$ 1.244.564.034 por km


Avance físico
4,93%
Frente a 42,9 % del plazo

Avance financiero
4,93 %


Plazo transcurrido
42,9 %
7,7 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **10/02/2026**
Terminación: **10/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

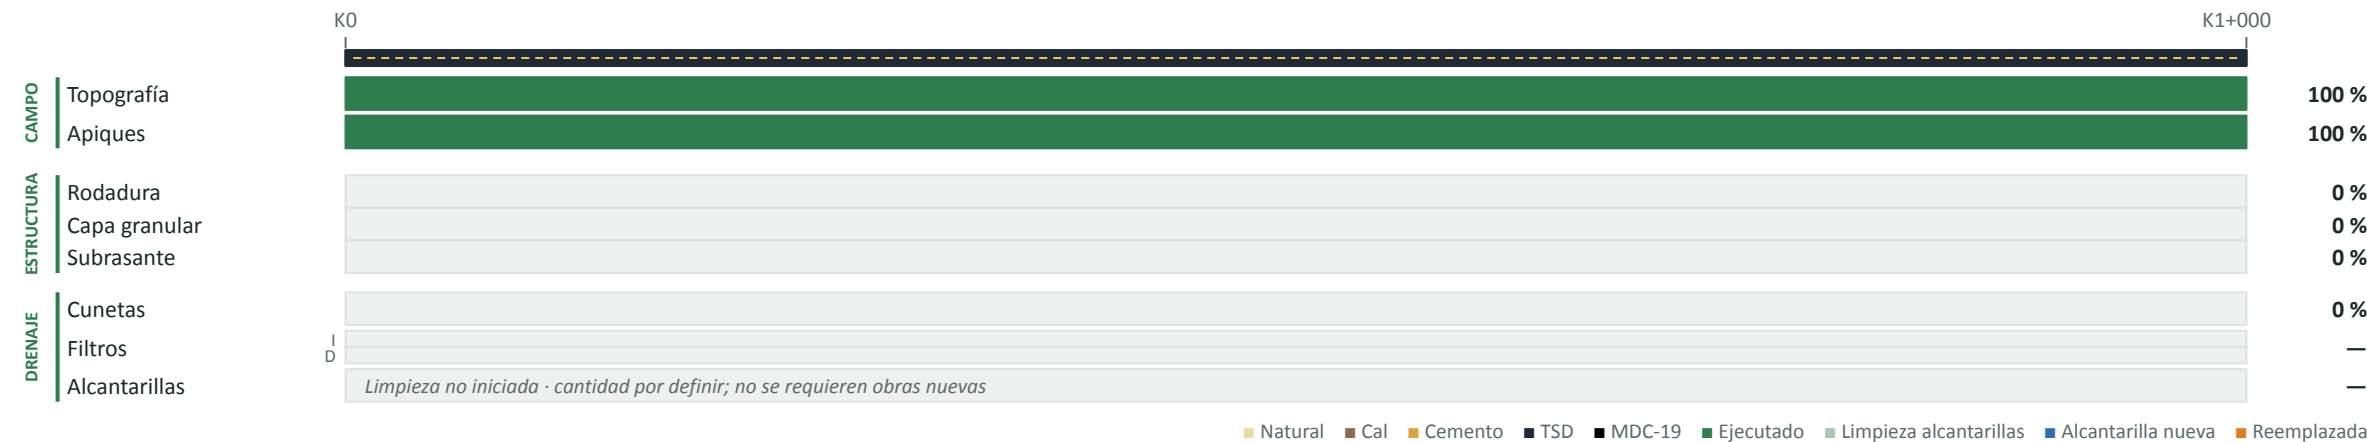

AVANCE POR ACTIVIDAD

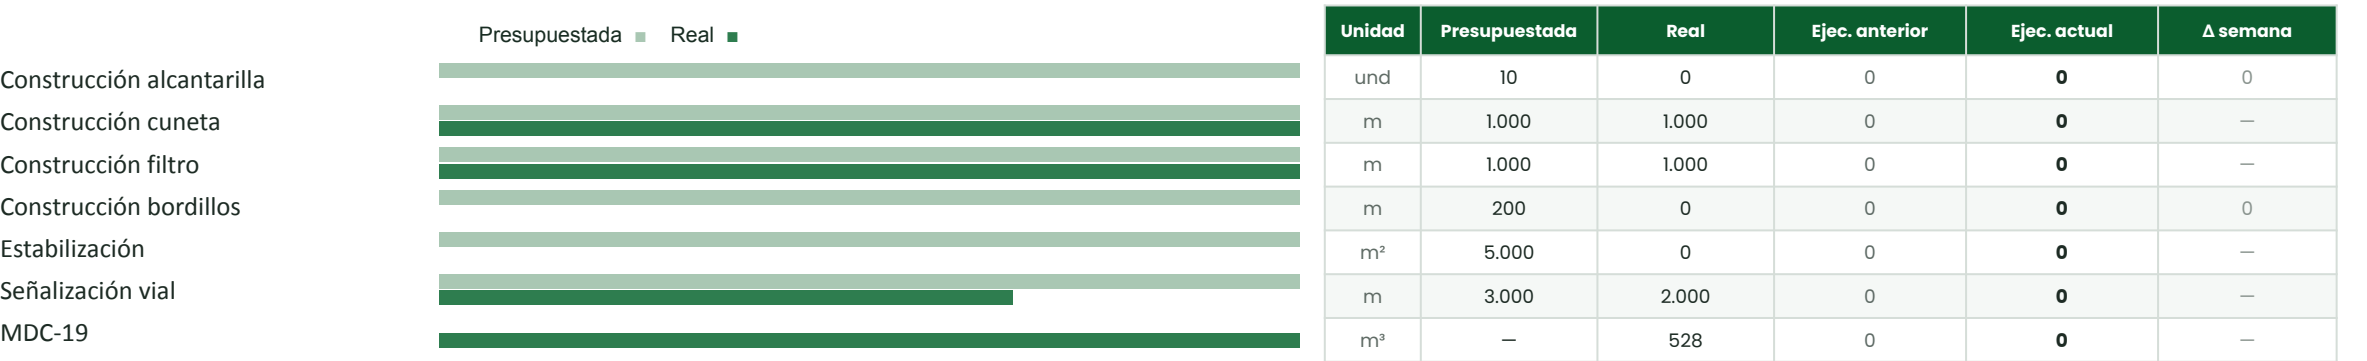

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



El Botón – Paso Ancho – Frontino

Longitud contractual

25,00 km

Longitud probable a cubrir

14,87 km

Valor por km contractual


\$ 1.182.756.962

Valor por km proyectado

\$ 1.988.019.114

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 20.131.553.811

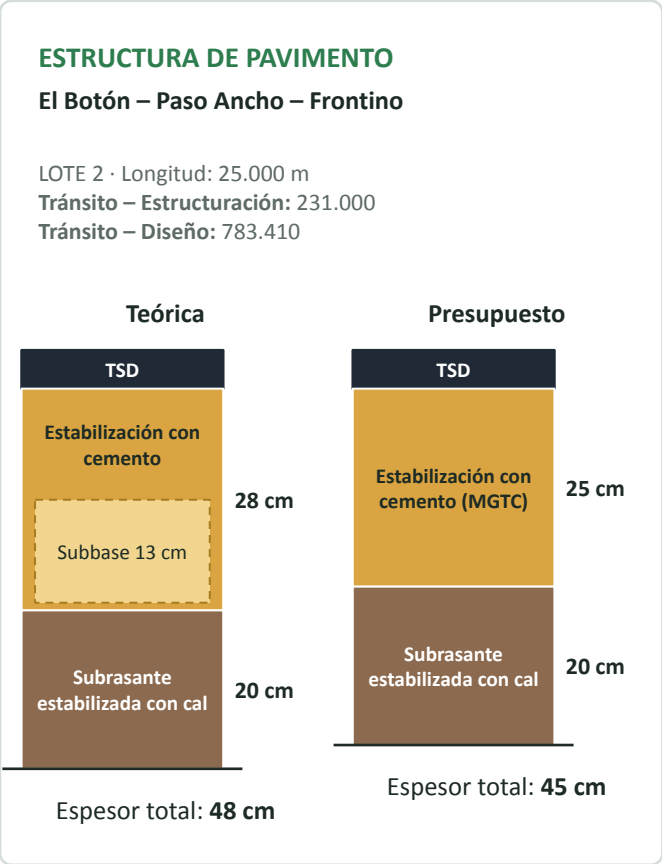

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)		% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 3.604.988.222	12%	\$ 4.667.886.071	9%	▲	\$ 1.062.897.849	29,5 %
Construcción cuneta	\$ 4.099.740.649	14%	\$ 6.943.612.851	14%	▲	\$ 2.843.872.202	69,4 %
Construcción filtro	\$ 4.671.931.000	16%	\$ 4.671.598.360	9%	▼	–\$ 332.640	0,0 %
Construcción bordillos	\$ 609.150.300	2%	\$ 181.606.867	0%	▼	–\$ 427.543.433	–70,2 %
Construcción disipadores	\$ 541.257.606	2%	\$ 272.514.567	1%	▼	–\$ 268.743.039	–49,7 %
Estabilización	\$ 15.674.137.390	53%	\$ 28.753.838.878	58%	▲	\$ 13.079.701.488	83,4 %
Señalización vial	\$ 367.718.875	1%	\$ 281.493.875	1%	▼	–\$ 86.225.000	–23,4 %
Obras no previstas (excavación, conformación, realces, colocación de subbase)	\$ –	0%	\$ 3.927.926.384	8%	▲	\$ 3.927.926.384	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 29.568.924.042	100%	\$ 49.700.477.853	100%	▲	+\$ 20.131.553.811	68,1 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

El Botón – Paso Ancho – Frontino

Longitud
25,00 km
Alcance real 14,87 km · dif. 10,13 km

Valor total del corredor
\$ 29.568.924.042
\$ 1.182.756.962 por km


Avance físico
18,25 %
Frente a 42,9 % del plazo

Avance financiero
18,25%


Plazo transcurrido
42,9 %
7,7 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **10/02/2026**
Terminación: **10/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

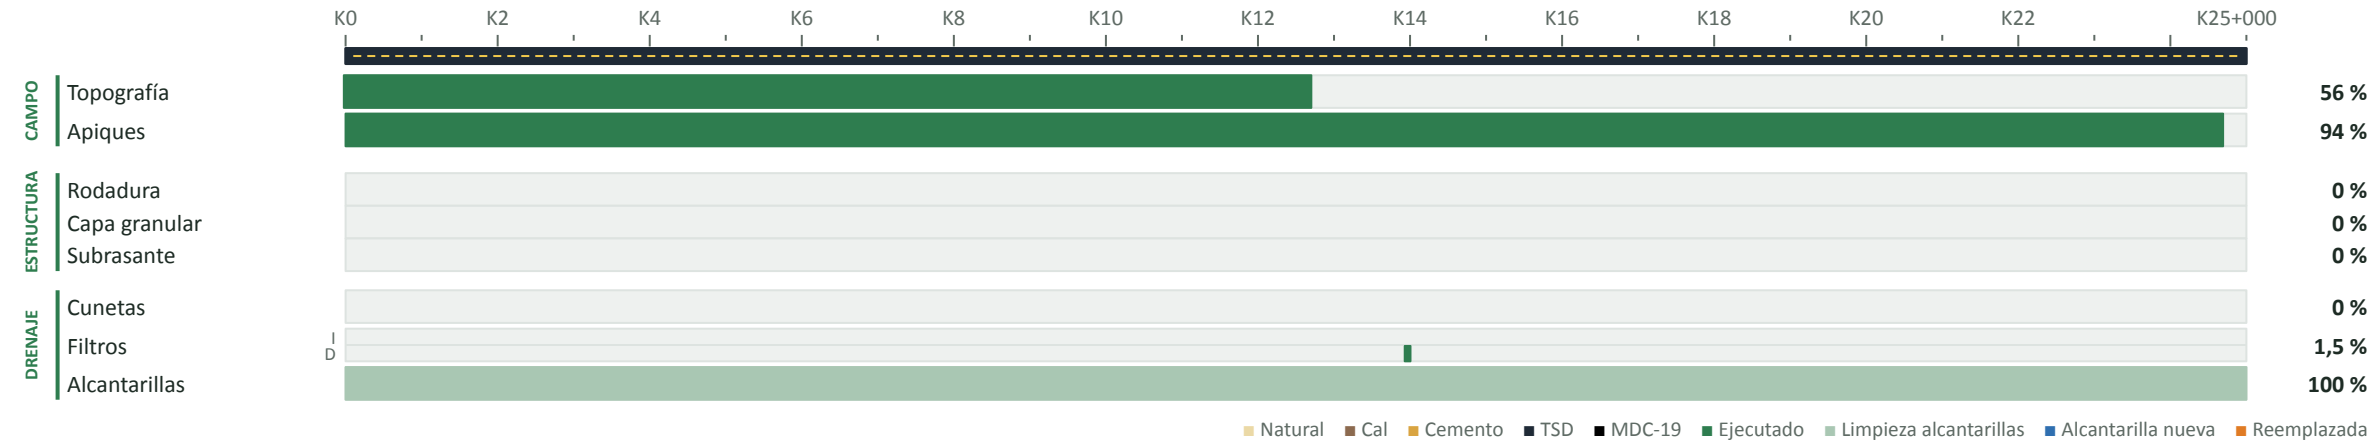

AVANCE POR ACTIVIDAD

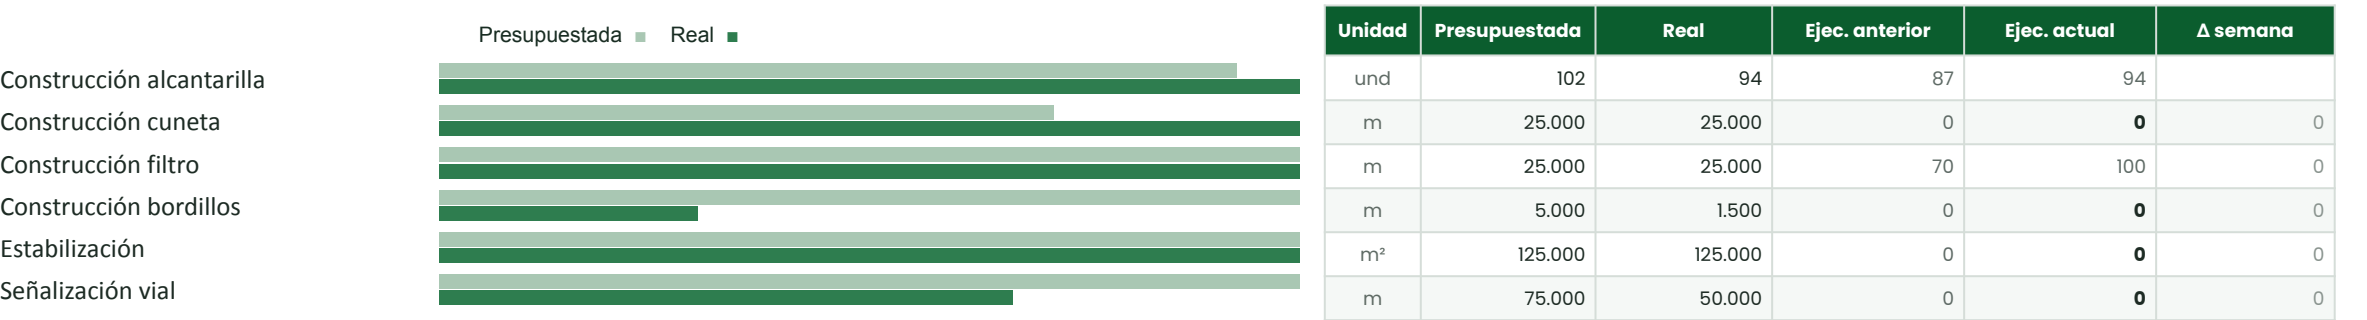

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Ebéjico – Heliconia – Medellín

Longitud contractual

28,76 km

Longitud probable a cubrir

17,95 km

Valor por km contractual


\$ 973.940.066

Valor por km proyectado

\$ 1.560.279.819

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 16.863.131.317

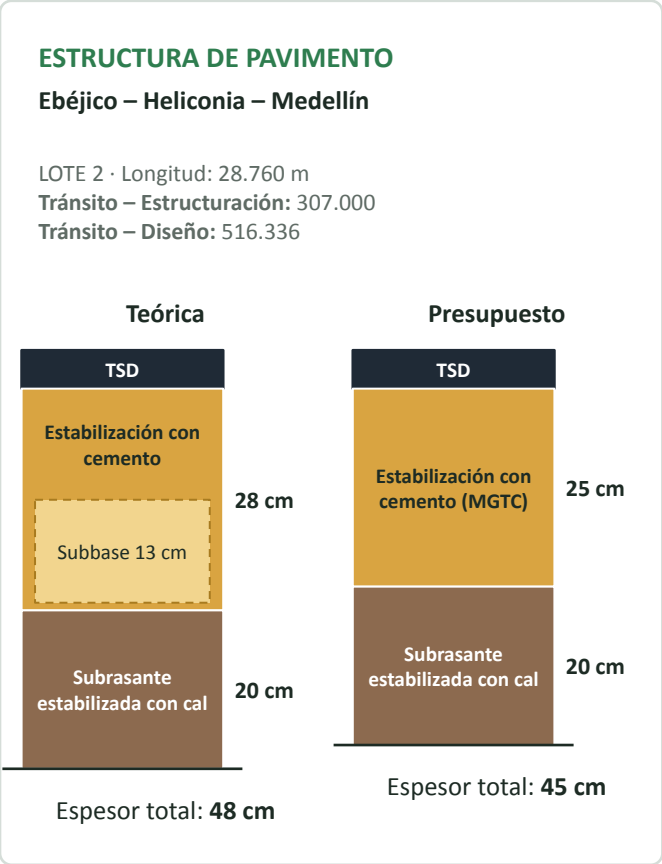

Ebéjico – Heliconia – Medellín

Longitud
28,76 km
Alcance real 17,95 km · dif. 10,81 km

Valor total del corredor
\$ 28.010.516.286
\$ 973.940.066 por km


Avance físico
14,74%
Frente a 42,9 % del plazo

Avance financiero
14,74 %


Plazo transcurrido
42,9 %
7,7 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **10/02/2026**
Terminación: **10/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

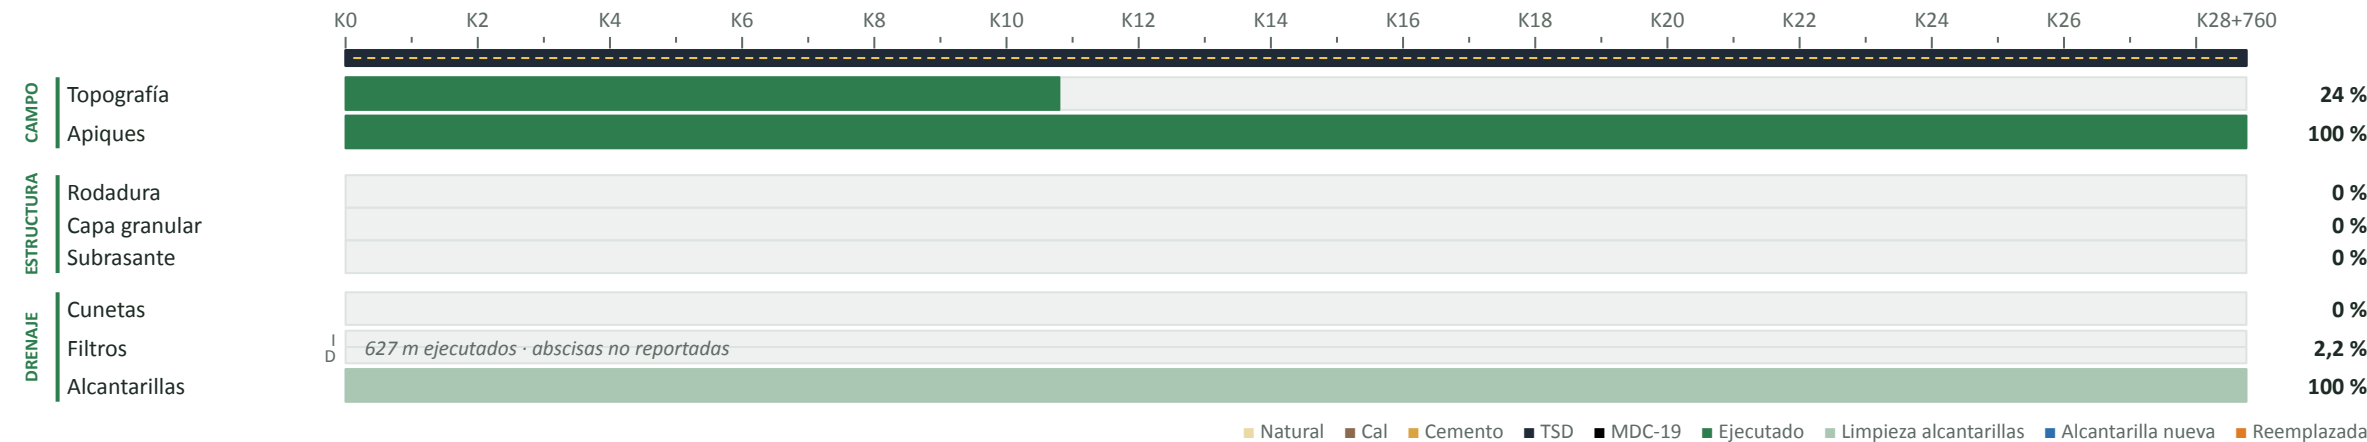

AVANCE POR ACTIVIDAD

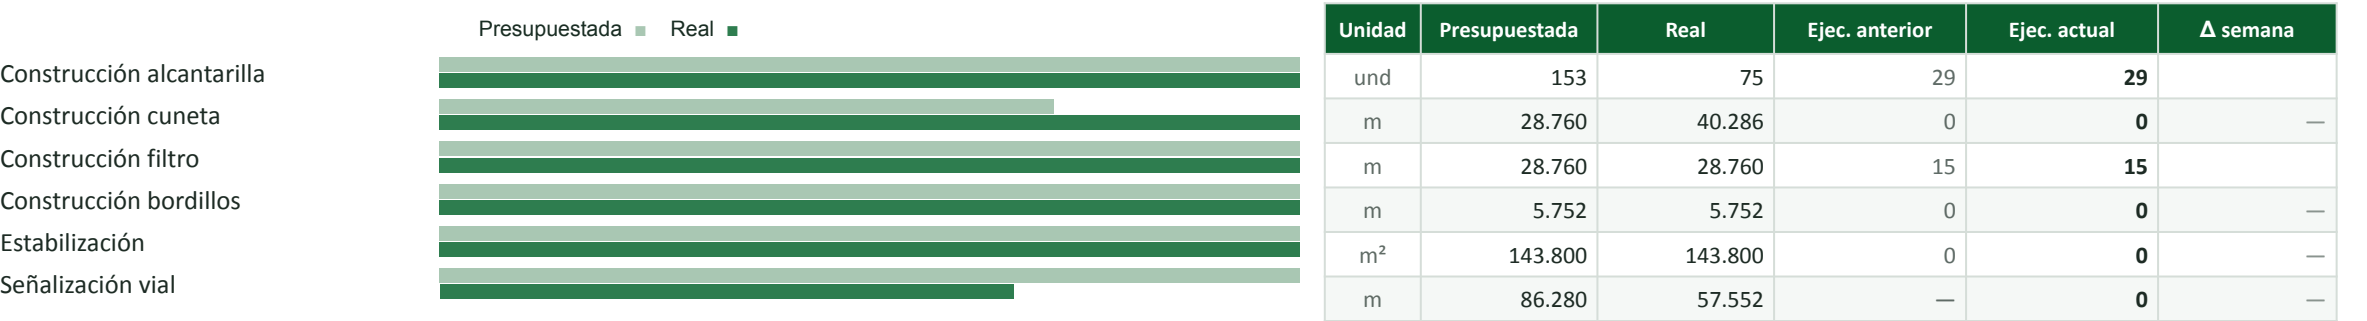

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Sopetrán – Horizontes – Belmira

Longitud contractual

35,19 km

Longitud probable a cubrir

25,30 km

Valor por km contractual

\$ 865.272.379

Valor por km proyectado

\$ 1.203.682.582

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 11.908.655.043

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Sopetrán – Horizontes – Belmira

LOTE 2 · Longitud: 35.190 m
Tránsito – Estructuración: 231.000
Tránsito – Diseño: 529.734

Teórica

TSD

Estabilización con cemento

Subbase 13 cm

Subrasante estabilizada con cal

28 cm

20 cm

Espesor total: 48 cm

Presupuesto

TSD

Estabilización con cemento (MGTC)

Aporte de MG para nivelación

15 cm

12-18 cm

Espesor total: 33 cm máx.

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)	% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 4.830.547.138	16%	\$ 1.155.166.676	3%	▼ -\$ 3.675.380.462	-76,1 %
Construcción cuneta	\$ 4.949.305.999	16%	\$ 7.924.132.990	19%	▲ \$ 2.974.826.991	60,1 %
Construcción filtro	\$ 4.961.179.665	16%	\$ 4.917.400.717	12%	▼ -\$ 43.778.948	-0,9 %
Construcción bordillos	\$ 857.464.758	3%	\$ 303.396.746	1%	▼ -\$ 554.068.012	-64,6 %
Construcción disipadores	\$ 814.112.620	3%	\$ 165.184.936	0%	▼ -\$ 648.927.684	-79,7 %
Estabilización	\$ 13.489.552.480	44%	\$ 20.963.422.616	49%	▲ \$ 7.473.870.136	55,4 %
Señalización vial	\$ 516.772.355	2%	\$ 395.402.045	1%	▼ -\$ 121.370.310	-23,5 %
Obras no previstas (excavación, conformación, realces, colocación de subbase)	\$ –	0%	\$ 6.533.483.332	15%	▲ \$ 6.533.483.332	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 30.448.935.015	100%	\$ 42.357.590.058	100%	▲ +\$ 11.908.655.043	39,1 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Sopetrán – Horizontes – Belmira

Longitud
35,19 km
Alcance real 25,30 km · dif. 9,89 km

Valor total del corredor
\$ 30.448.935.015
\$ 865.272.379 por km


Avance físico
14 %
Frente a 42,9 % del plazo

Avance financiero
14 %


Plazo transcurrido
42,9 %
7,7 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **10/02/2026**
Terminación: **10/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISAS

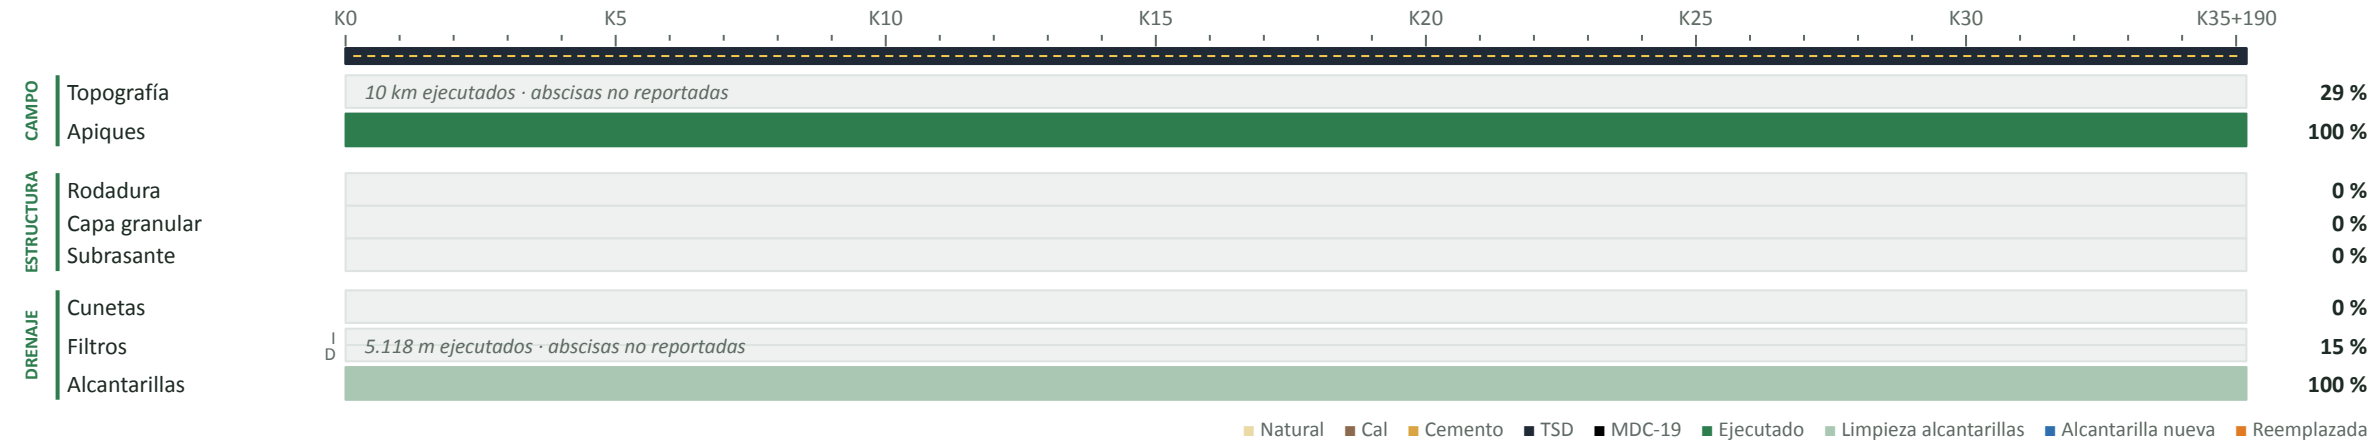

AVANCE POR ACTIVIDAD

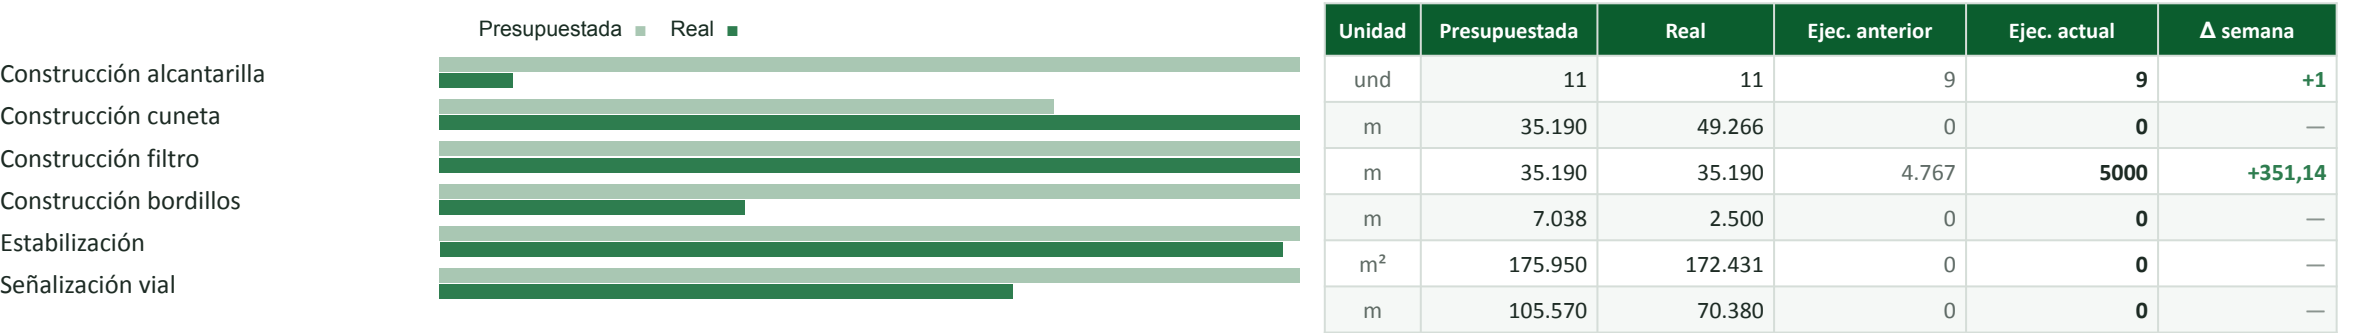

Consolidado Lote 2 – Occidente

Km contratados

94,95 km

5 corredores

Km que se alcanzan

62,33 km

Cobertura 64,7 % del valor proyectado

Valor contractual

\$ 94.504.845.551

\$ 995.311.696 por km

Valor proyectado

\$ 146.168.184.904

\$ 1.539.422.695 por km

Adición estimada

▲ \$ 51.663.339.353

+54,7 % sobre lo contractual

Corredor	Longitud (km)	Valor contractual	\$/km contractual	Valor proyectado	\$/km proyectado	Longitud probable (km)	Variación (valor adicional)	% variación	Cobertura
Miserenga – Ebéjico	1,00	\$ 1.244.564.034	\$ 1.244.564.034	\$ 1.539.355.914	\$ 1.539.355.914	0,81	▲ \$ 294.791.880	23,7 %	80,8 %
El Botón – Paso Ancho – Frontino	25,00	\$ 29.568.924.042	\$ 1.182.756.962	\$ 49.700.477.853	\$ 1.988.019.114	14,87	▲ \$ 20.131.553.811	68,1 %	59,5 %
Ebéjico – Heliconia – Medellín	28,76	\$ 28.010.516.286	\$ 973.940.066	\$ 44.873.647.603	\$ 1.560.279.819	17,95	▲ \$ 16.863.131.317	60,2 %	62,4 %
Sopetrán – Horizontes – Belmira	35,19	\$ 30.448.935.015	\$ 865.272.379	\$ 42.357.590.058	\$ 1.203.682.582	25,30	▲ \$ 11.908.655.043	39,1 %	71,9 %
SUBTOTAL CORREDORES CON PROYECCIÓN	89,95	\$ 89.272.939.377	\$ 992.472.922	\$ 138.471.071.428	\$ 1.539.422.695	58,93	▲ \$ 49.198.132.051	55,1 %	64,5 %
Titiribí – Armenia *	5,00	\$ 5.231.906.174	\$ 1.046.381.235	\$ 7.697.113.476	\$ 1.539.422.695	3,40	▲ \$ 2.465.207.302	47,1 %	68,0 %
TOTAL LOTE	94,95	\$ 94.504.845.551	\$ 995.311.696	\$ 146.168.184.904	\$ 1.539.422.695	62,33	▲ \$ 51.663.339.353	54,7 %	64,7 %

* Valor contractual según presupuesto del oferente; valor proyectado estimado con el promedio del valor por km proyectado de los corredores con proyección del lote (\$ 1.539.422.695).

Valor total del contrato \$ 104.855.613.958 · Valor contractual de obra \$ 94.504.845.551 · Valores reembolsables \$ 10.350.768.407.

Longitud probable = longitud × valor contractual ÷ valor proyectado · Cobertura = valor contractual ÷ valor proyectado.

KILÓMETROS DEL LOTE QUE SE CUBREN CON EL VALOR CONTRACTUAL



San Pedro de Urabá – Necoclí

Longitud contractual

58,65 km

Longitud probable a cubrir

39,99 km

Valor por km contractual


\$ 1.086.177.100

Valor por km proyectado

\$ 1.593.059.747

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 29.728.667.230

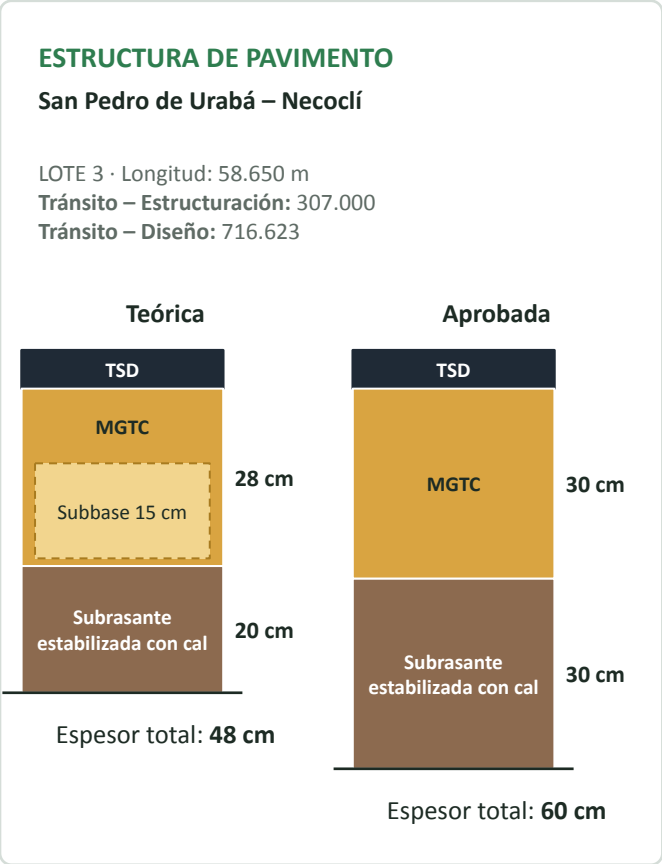

San Pedro de Urabá – Necoclí

Longitud
58,65 km
Alcance real 39,99 km · dif. 18,66 km

Valor total del corredor
\$ 70.238.328.568
\$ 1.197.584.460 por km


Avance físico
3,23 %
Frente a 44,0 % del plazo

Avance financiero
6,65 %


Plazo transcurrido
44,0 %
7,9 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **04/02/2026**
Terminación: **03/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

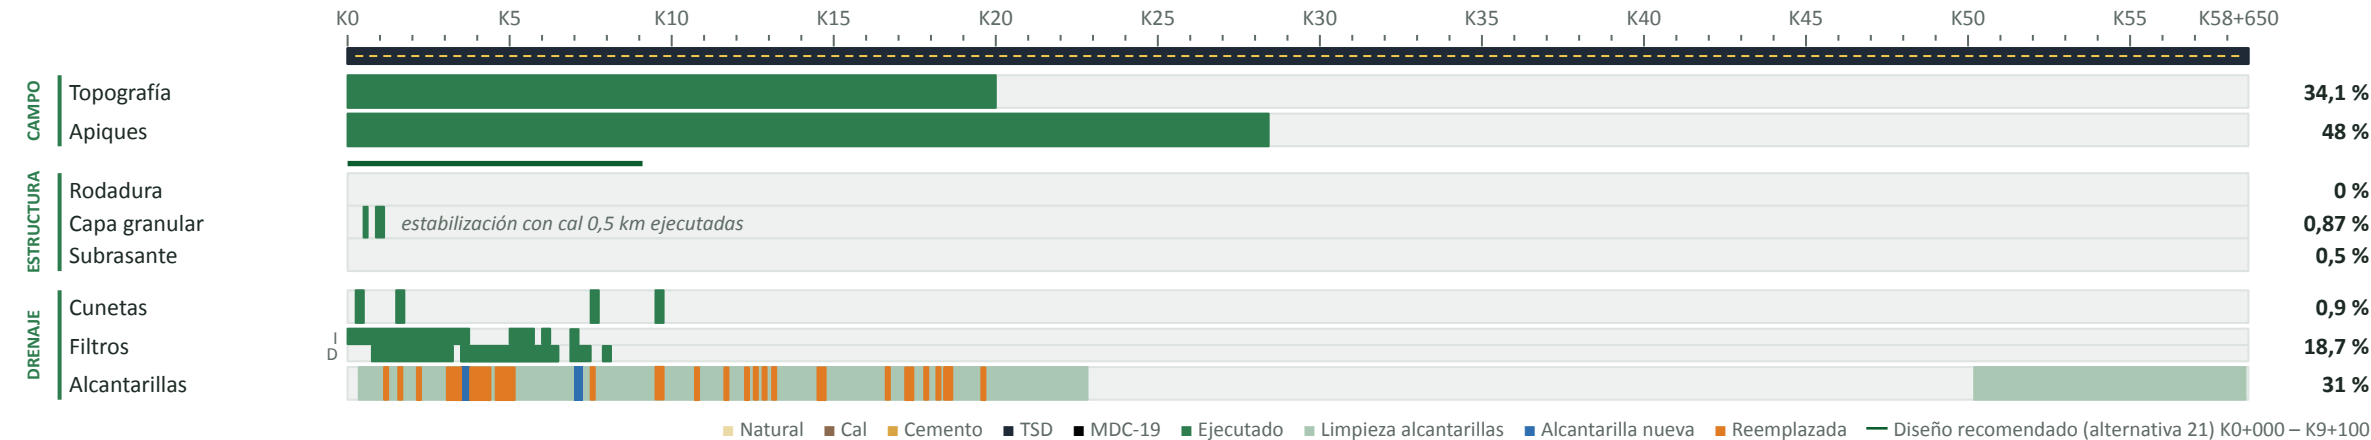

AVANCE POR ACTIVIDAD

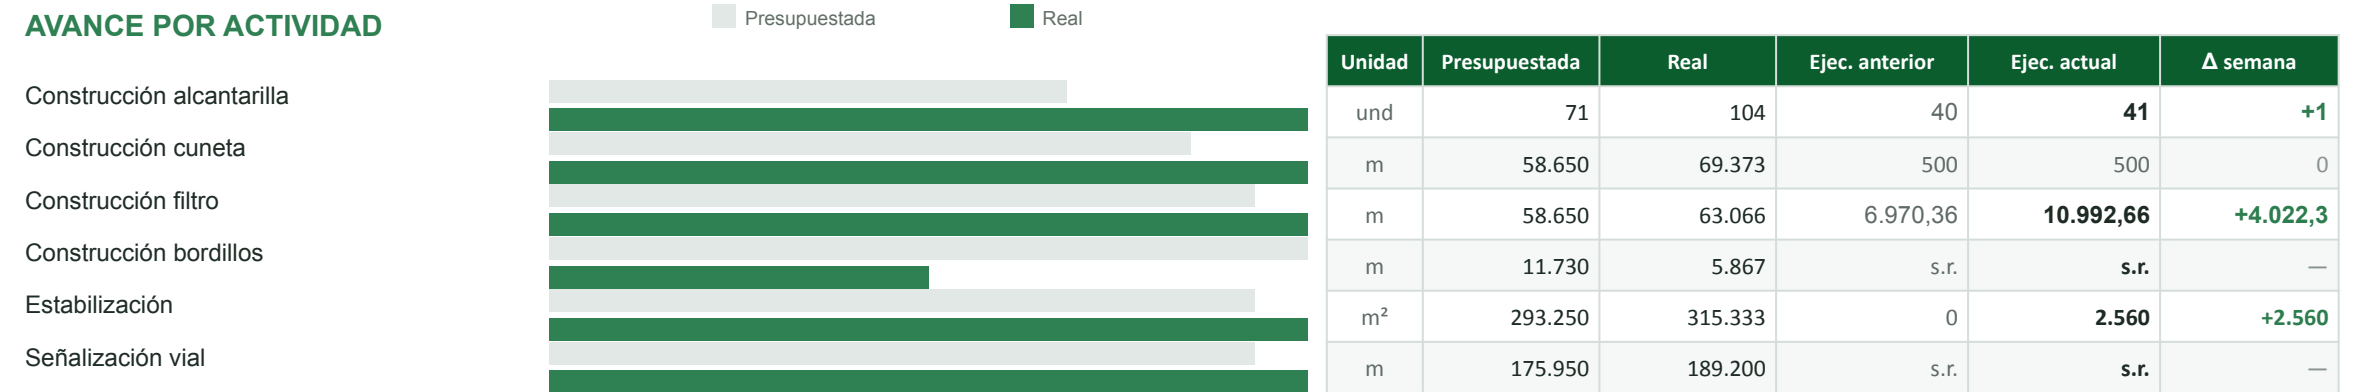

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Mutatá – Pavarandó

Longitud contractual

10,00 km

Longitud probable a cubrir

10,00 km

Valor por km contractual


\$ 1.015.886.186

Valor por km proyectado

\$ 1.015.886.186

Variación total (valor adicional)

\$ 0

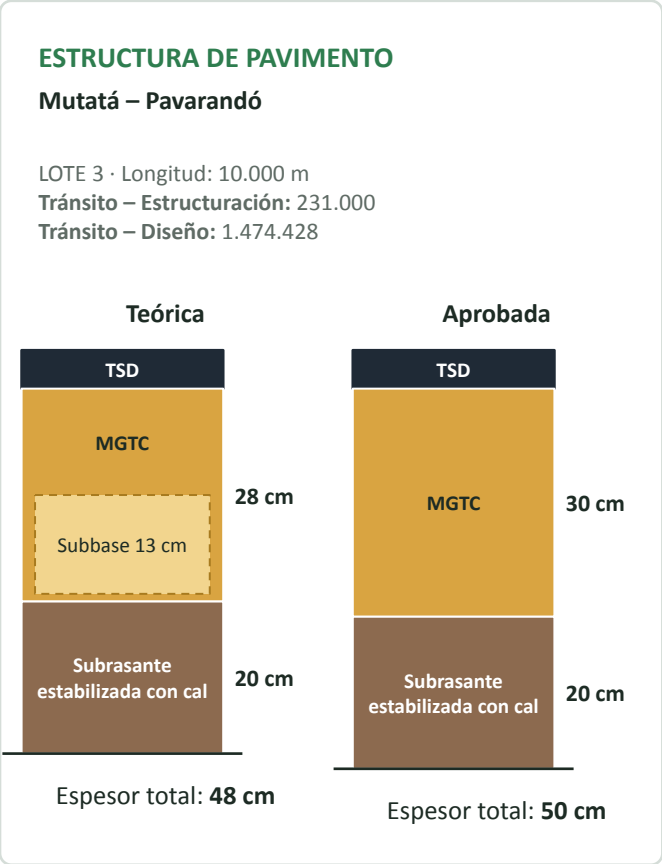

Mutatá – Pavarandó

Longitud

10,00 km

Alcance real 10,00 km · dif. 0,00 km

Valor total del corredor

\$ 11.333.658.988

\$ 1.133.365.899 por km

Avance físico

26,58 %

Frente a 44,0 % del plazo

Avance financiero

39,53 %

Plazo transcurrido

44,0 %


7,9 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: 04/02/2026

Terminación: 03/08/2027

Corte: 25/09/2026

AVANCE POR ABCISA

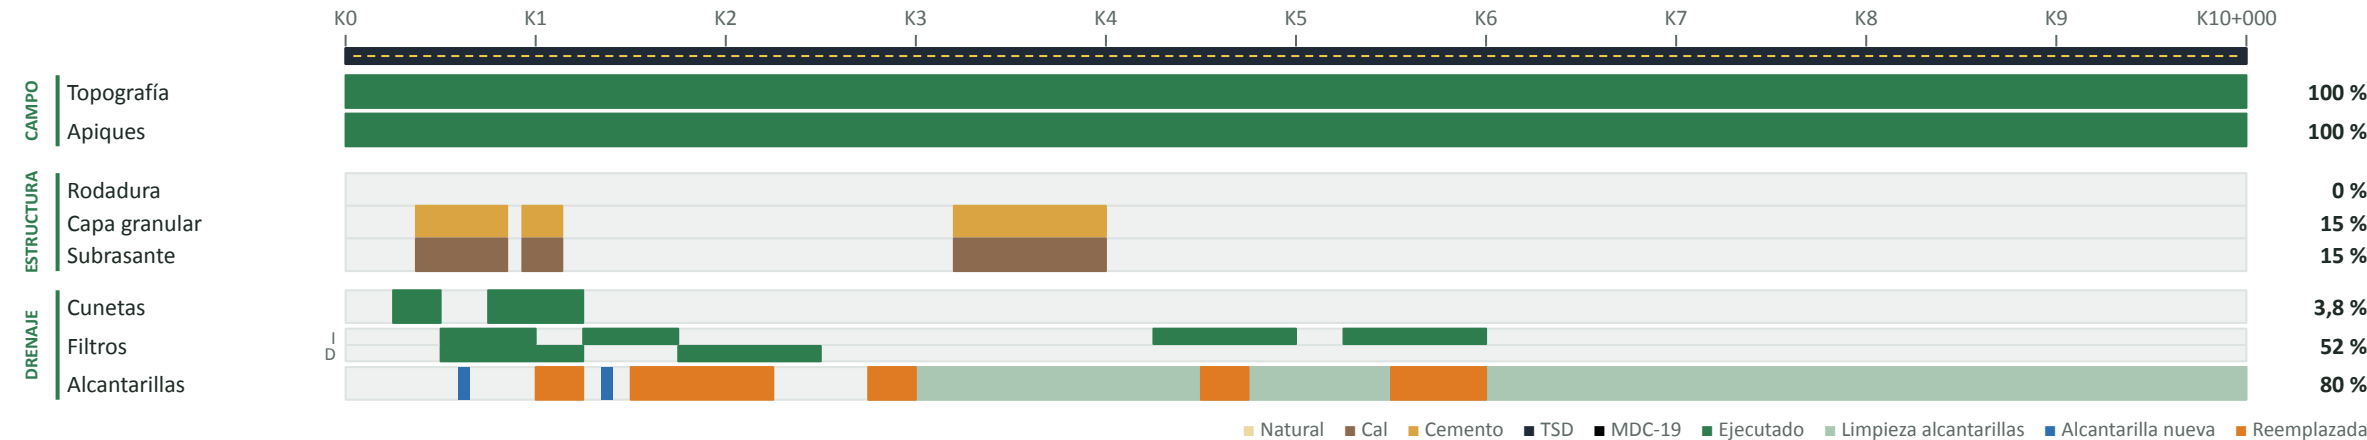

AVANCE POR ACTIVIDAD

		Unidad	Presupuestada	Ejec. anterior	Ejec. actual	Δ semana
Topografía	100 %	km	10	10	10	0
Apiques	100 %	und	40	40	40	0
Limpieza alcantarillas	80 %	und	20	16	16	0
Alcantarillas	30 %	und	40	11	12	+1
Filtros	52 %	m	5.000	2.420	2.620	+200
Estabilización	15 %	km	9,663	0,24	1,49	+1,25
Cunetas	3,8 %	m	10.000	0	383	+383
Bordillos	0 %	m	2.000	s.r.	s.r.	—
Señalización	0 %	ml	30.000	s.r.	s.r.	—

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



El Tres – San Pedro de Urabá

Longitud contractual

22,00 km

Longitud probable a cubrir

15,00 km

Valor por km contractual

\$ 895.708.891

Valor por km proyectado

\$ 1.313.706.373


Variación total (valor adicional)

▲ \$ 9.195.944.613

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

El Tres – San Pedro de Urabá

LOTE 3 · Longitud: 22.000 m
Tránsito – Estructuración: 169.000
Tránsito – Diseño: 1.913.507

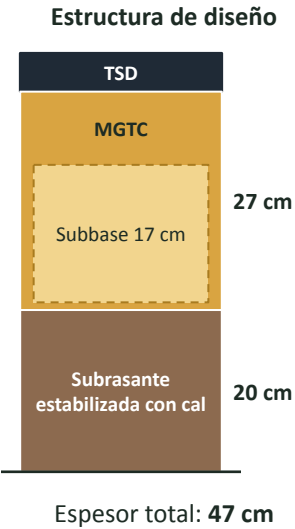

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)		% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 1.120.622.449	5,69%	\$ 1.973.045.202	6,83%	▲	\$ 852.422.753	76,1 %
Construcción cuneta	\$ 3.371.580.468	17,11%	\$ 3.669.417.424	12,70%	▲	\$ 297.836.956	8,8 %
Construcción filtro	\$ 3.895.544.224	19,77%	\$ 2.897.470.380	10,03%	▼	–\$ 998.073.844	–25,6 %
Construcción bordillos	\$ 496.986.512	2,52%	\$ 18.233.777	0,06%	▼	–\$ 478.752.735	–96,3 %
Construcción disipadores	\$ 140.609.126	0,71%	\$ 220.479.051	0,76%	▲	\$ 79.869.925	56,8 %
Estabilización	\$ 10.380.219.677	52,68%	\$ 19.822.861.235	68,59%	▲	\$ 9.442.641.558	91,0 %
Señalización vial	\$ 300.033.140	1,52%	\$ 300.033.140	1,04%		\$ 0	0,0 %
TOTAL CORREDOR	\$ 19.705.595.596	100%	\$ 28.901.540.209	100%	▲	+\$ 9.195.944.613	46,7 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

El Tres – San Pedro de Urabá

Longitud
22,00 km
Alcance real 15,00 km · dif. 7,00 km

Valor total del corredor
\$ 19.705.595.508
\$ 895.708.887 por km


Avance físico
1,82 %
Frente a 44,0 % del plazo

Avance financiero
5,04 %


Plazo transcurrido
44,0 %
7,9 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **04/02/2026**
Terminación: **03/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

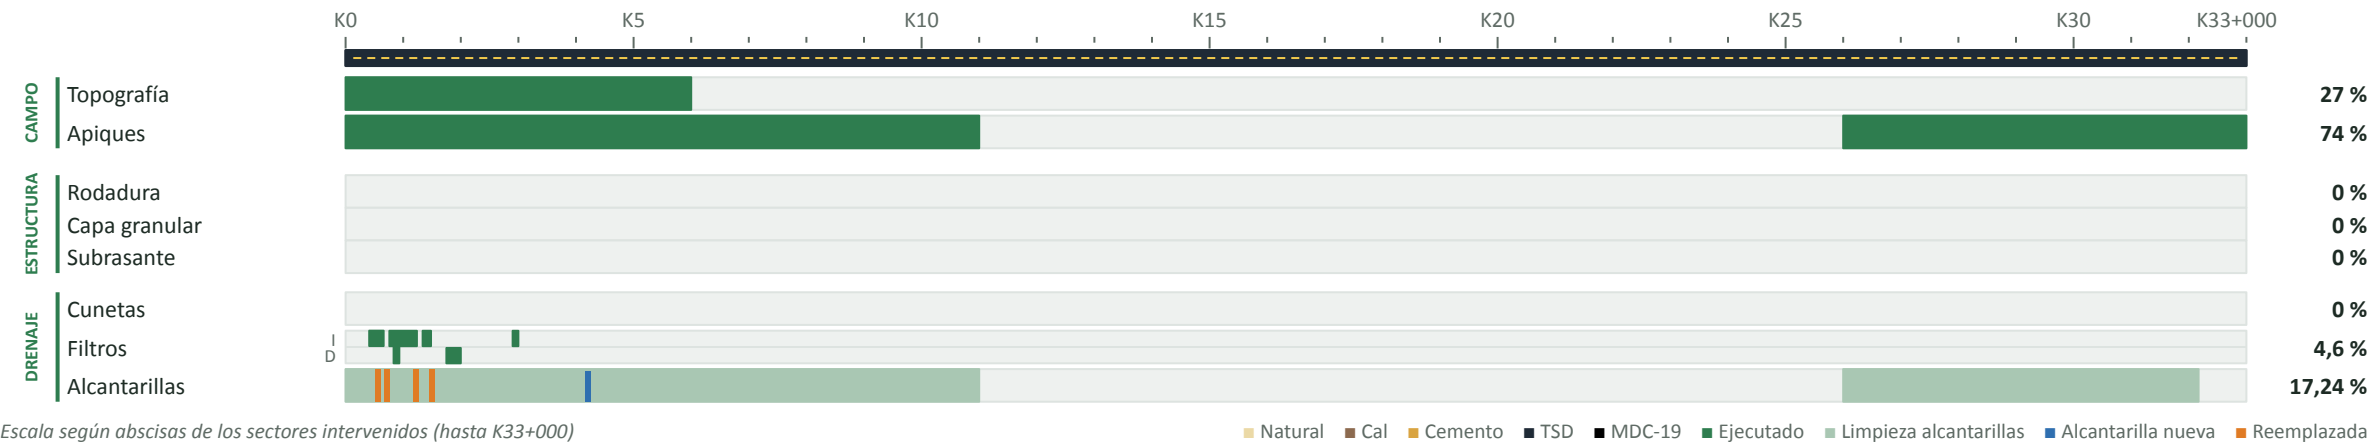

AVANCE POR ACTIVIDAD

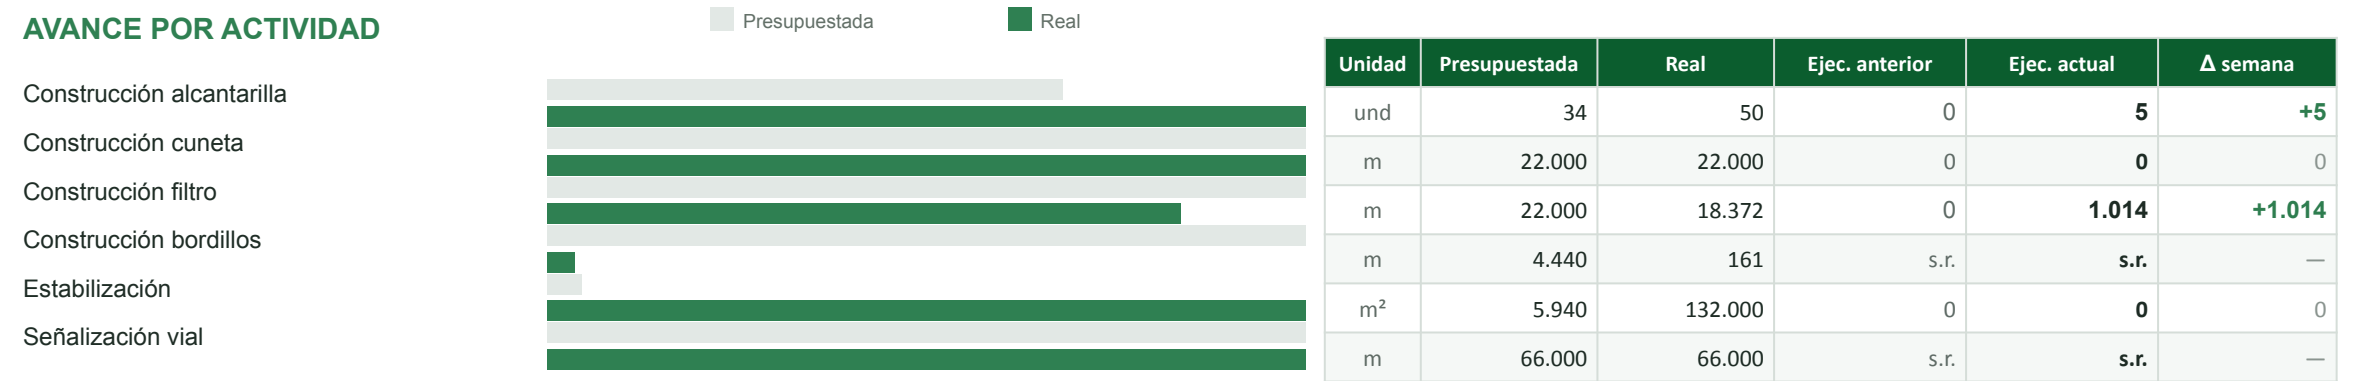

Nota: Solo se presupuestó 1,88 km de estabilización de los 22 km requeridos.

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Inicio: 04/02/2026 · Terminación: 03/08/2027 · Al: 02/10/2026 · 240 de 545 días



Arboletes – San Pedro de Urabá

Longitud contractual

30,00 km

Longitud probable a cubrir

21,60 km

Valor por km contractual

\$ 1.252.205.808

Valor por km proyectado

\$ 1.738.790.741

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 14.597.547.971

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Arboletes – San Pedro de Urabá

LOTE 3 · Longitud: 30.000 m
Tránsito – Estructuración: 231.000
Tránsito – Diseño: 294.281

Estructura de diseño

TSD

MGTC

Subbase 15 cm

Subrasante estabilizada con cal

28 cm

20 cm

Espesor total: 48 cm

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)		% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 2.224.103.886	5,92%	\$ 3.956.822.408	7,59%	▲	\$ 1.732.718.522	77,9 %
Construcción cuneta	\$ 4.980.491.692	13,26%	\$ 8.273.273.788	15,86%	▲	\$ 3.292.782.096	66,1 %
Construcción filtro	\$ 6.637.296.000	17,67%	\$ 7.833.584.000	15,02%	▲	\$ 1.196.288.000	18,0 %
Construcción bordillos	\$ 677.708.880	1,80%	\$ 331.523.211	0,64%	▼	–\$ 346.185.669	–51,1 %
Construcción disipadores	\$ 310.799.979	0,83%	\$ 455.839.969	0,87%	▲	\$ 145.039.990	46,7 %
Estabilización	\$ 22.326.637.710	59,43%	\$ 30.837.626.370	59,12%	▲	\$ 8.510.988.660	38,1 %
Señalización vial	\$ 409.136.100	1,09%	\$ 475.052.472	0,91%	▲	\$ 65.916.372	16,1 %
TOTAL CORREDOR	\$ 37.566.174.247	100%	\$ 52.163.722.218	100%	▲	+\$ 14.597.547.971	38,9 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Arboletes – San Pedro de Urabá

Longitud
30,00 km
Alcance real 21,60 km · dif. 8,40 km

Valor total del corredor
\$ 41.437.224.038
\$ 1.381.240.801 por km


Avance físico
0,004 %
Frente a 44,0 % del plazo

Avance financiero
0,02 %

Plazo transcurrido
44,0 %
7,9 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **04/02/2026**
Terminación: **03/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

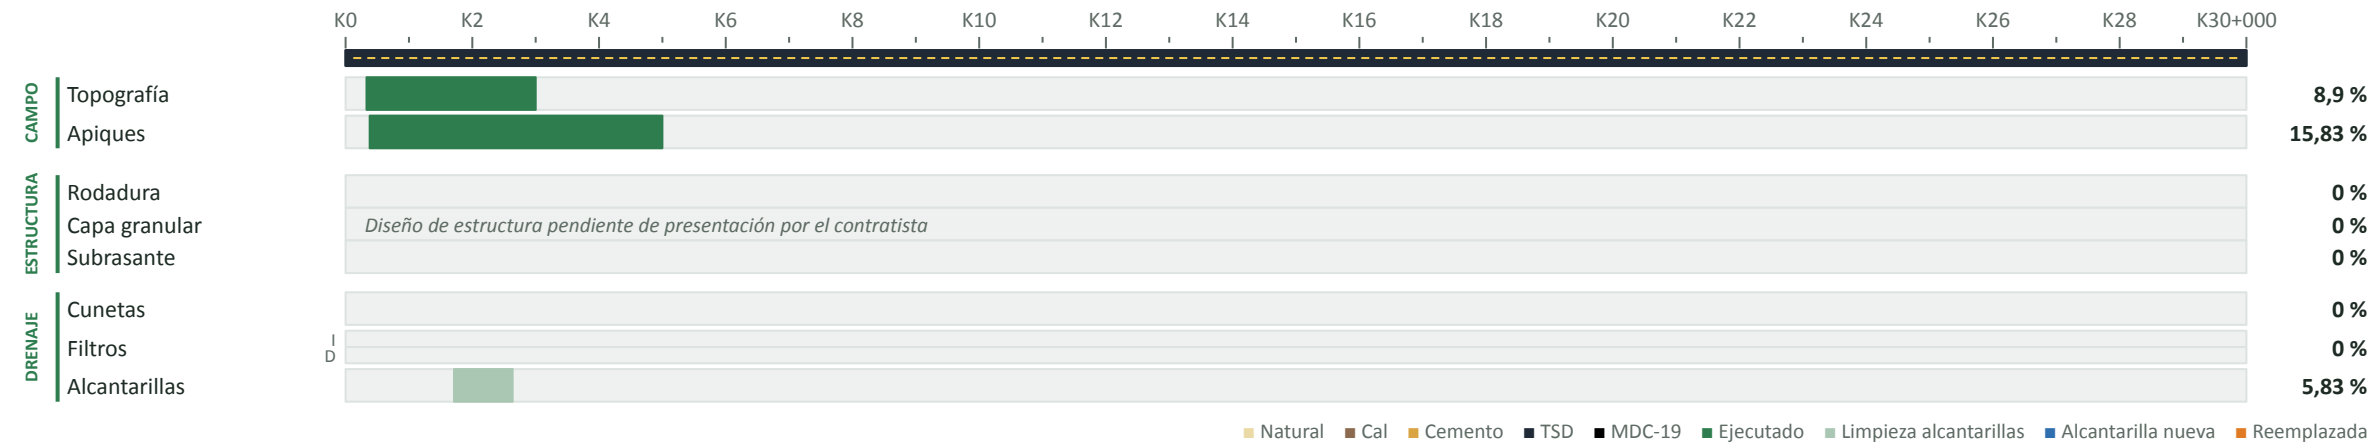

AVANCE POR ACTIVIDAD

	Presupuestada	Real				
	Unidad	Presupuestada	Real	Ejec. anterior	Ejec. actual	Δ semana
Construcción alcantarilla	und	62	91	0	0	0
Construcción cuneta	m	30.000	44.000	0	0	0
Construcción filtro	m	30.000	44.000	0	0	0
Construcción bordillos	m	6.000	2.933	s.r.	s.r.	—
Estabilización	m²	150.000	174.000	0	0	0
Señalización vial	m	90.000	90.000	s.r.	s.r.	—

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Consolidado Lote 3 – Urabá

Km contratados

120,65 km

4 corredores

Km que se alcanzan

86,59 km

Cobertura 71,0 % del valor proyectado

Valor contractual

\$ 131.134.918.626

\$ 1.086.903.594 por km

Valor proyectado

\$ 184.657.078.439

\$ 1.530.518.677 por km

Adición estimada

▲ \$ 53.522.159.813

+40,8 % sobre lo contractual

Corredor	Longitud (km)	Valor contractual	\$/km contractual	Valor proyectado	\$/km proyectado	Longitud probable (km)	Variación (valor adicional)	% variación	Cobertura
San Pedro de Urabá – Necoclí	58,65	\$ 63.704.286.922	\$ 1.086.177.100	\$ 93.432.954.152	\$ 1.593.059.747	39,99	▲ \$ 29.728.667.230	46,7 %	68,2 %
Mutatá – Pavarandó	10,00	\$ 10.158.861.861	\$ 1.015.886.186	\$ 10.158.861.860	\$ 1.015.886.186	10,00	\$ 0	0,0 %	100,0 %
El Tres – San Pedro de Urabá	22,00	\$ 19.705.595.596	\$ 895.708.891	\$ 28.901.540.209	\$ 1.313.706.373	15,00	▲ \$ 9.195.944.613	46,7 %	68,2 %
Arboletes – San Pedro de Urabá	30,00	\$ 37.566.174.247	\$ 1.252.205.808	\$ 52.163.722.218	\$ 1.738.790.741	21,60	▲ \$ 14.597.547.971	38,9 %	72,0 %
TOTAL LOTE	120,65	\$ 131.134.918.626	\$ 1.086.903.594	\$ 184.657.078.439	\$ 1.530.518.677	86,59	▲ \$ 53.522.159.813	40,8 %	71,0 %

Valor total del contrato \$ 144.973.755.369 · Valor contractual de obra \$ 131.134.918.626 · Valores reembolsables \$ 13.838.836.743.

Longitud probable = longitud × valor contractual ÷ valor proyectado · Cobertura = valor contractual ÷ valor proyectado.

KILÓMETROS DEL LOTE QUE SE CUBREN CON EL VALOR CONTRACTUAL

86,59 km · 71,8 % se alcanza

34,06 km · 28,2 % pendiente

Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío

Longitud contractual

25,00 km

Longitud probable a cubrir

15,47 km

Valor por km contractual


\$ 974.030.486

Valor por km proyectado

\$ 1.574.030.486

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 15.000.000.000

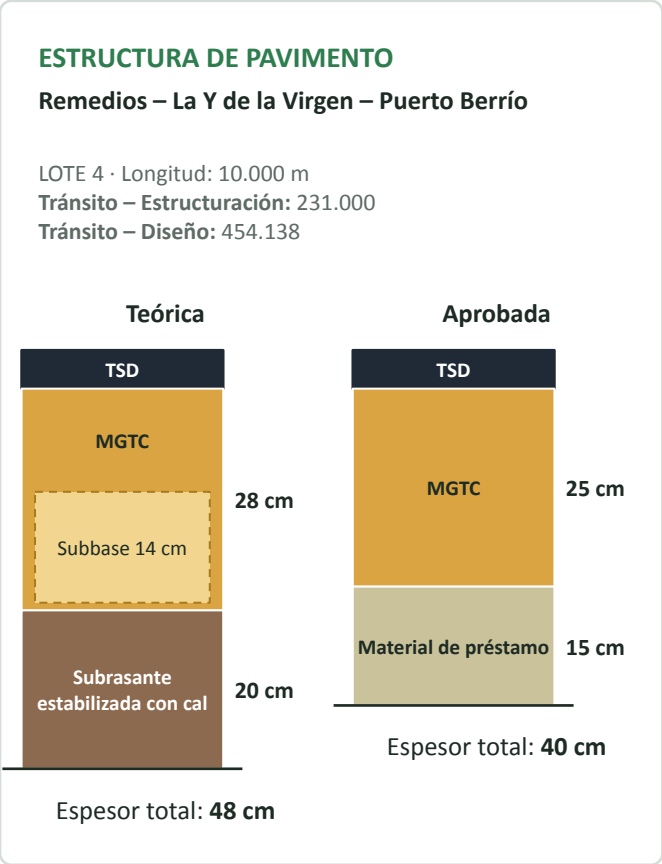

Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío

Longitud
25,00 km
Alcance real 25,00 km · dif. 0,00 km

Valor total del corredor
\$ 24.350.762.146
\$ 974.030.486 por km


Avance físico
3,53 %
Frente a 42,9 % del plazo

Avance financiero
3,97 %

Plazo transcurrido
42,9 %
7,7 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **10/02/2026**
Terminación: **10/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

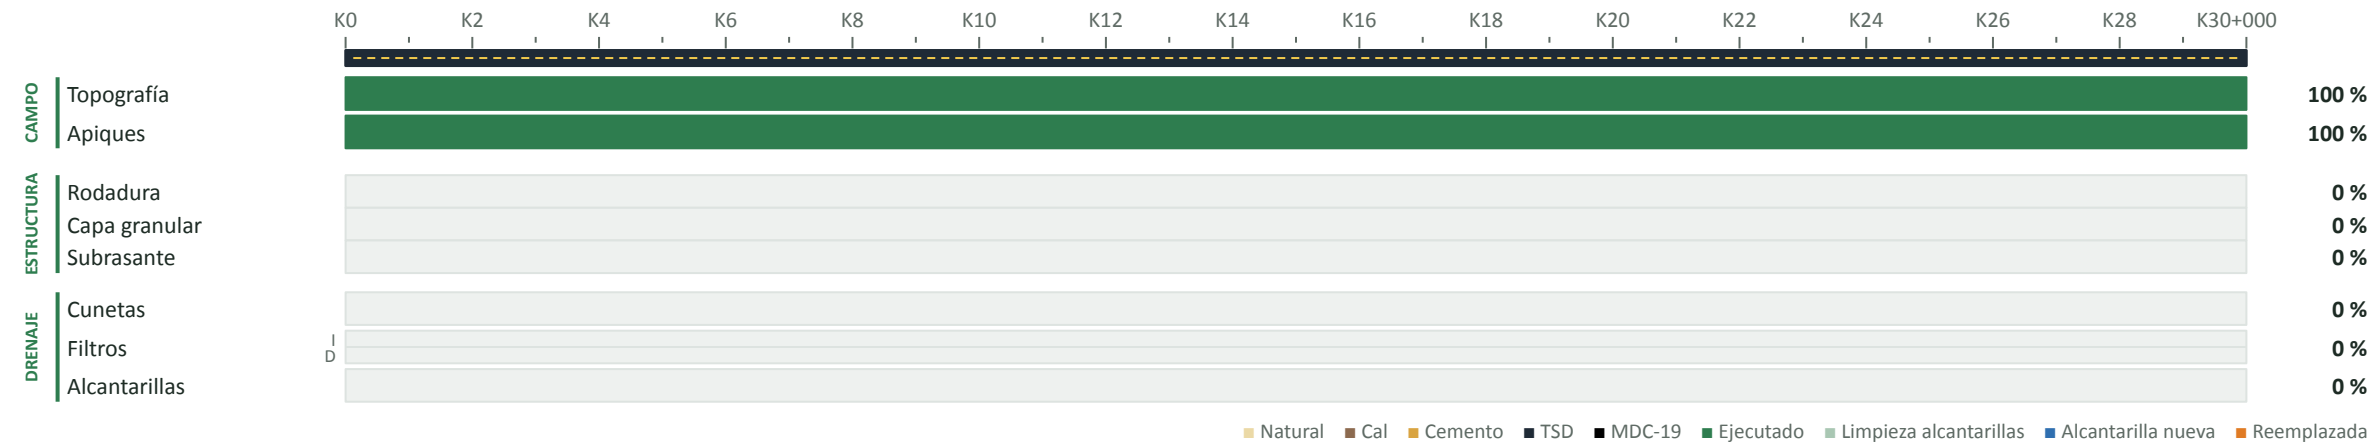

AVANCE POR ACTIVIDAD

	Unidad	Presupuestada	Ejec. anterior	Ejec. actual	Δ semana
Topografía	km	25	25	25	0
Apiques	und	100	90	90	0
Limpieza obras transversales	und	108	24	24	+40,5 ml
Alcantarillas construidas	und	108	0	0	+6,74 ml
Filtros	m	25.000	170	220	+220
Conformación y adecuación	m	25.000	80	960	—
Estabilización	m	25.000	200	390	+0,17
Cunetas	m	25.000	0	s.r.	—
Bordillos	m	6.000	0	s.r.	—
Señalización	ml	N/A	0	s.r.	—

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Consolidado Lote 4 – Magdalena Medio

Km contratados

55,00 km

2 corredores

Km que se alcanzan

32,76 km

Cobertura 59,6 % del valor proyectado

Valor contractual

\$ 51.571.662.606

\$ 937.666.593 por km

Valor proyectado

\$ 86.571.676.721

\$ 1.574.030.486 por km

Adición estimada

▲ \$ 35.000.014.115

+67,9 % sobre lo contractual

Corredor	Longitud (km)	Valor contractual	\$/km contractual	Valor proyectado	\$/km proyectado	Longitud probable (km)	Variación (valor adicional)	% variación	Cobertura
Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío	25,00	\$ 24.350.762.146	\$ 974.030.486	\$ 39.350.762.146	\$ 1.574.030.486	15,47	▲ \$ 15.000.000.000	61,6 %	61,9 %
SUBTOTAL CORREDORES CON PROYECCIÓN	25,00	\$ 24.350.762.146	\$ 974.030.486	\$ 39.350.762.146	\$ 1.574.030.486	15,47	▲ \$ 15.000.000.000	61,6 %	61,9 %
La Ye – Yondó *	30,00	\$ 27.220.900.460	\$ 907.363.349	\$ 47.220.914.575	\$ 1.574.030.486	17,29	▲ \$ 20.000.014.115	73,5 %	57,6 %
TOTAL LOTE	55,00	\$ 51.571.662.606	\$ 937.666.593	\$ 86.571.676.721	\$ 1.574.030.486	32,76	▲ \$ 35.000.014.115	67,9 %	59,6 %

* Valor contractual según presupuesto del oferente; valor proyectado estimado con el promedio del valor por km proyectado de los corredores con proyección del lote (\$ 1.574.030.486).

Valor total del contrato \$ 54.441.800.920 · Valor contractual de obra \$ 51.571.662.606 · Valores reembolsables \$ 2.870.138.314.

Longitud probable = longitud × valor contractual ÷ valor proyectado · Cobertura = valor contractual ÷ valor proyectado.

KILÓMETROS DEL LOTE QUE SE CUBREN CON EL VALOR CONTRACTUAL

32,76 km · 59,6 % se alcanza

22,24 km · 40,4 % pendiente

Salgar – La Cámara – La Quiebra

Longitud contractual

15,93 km

Longitud probable a cubrir

Valor por km contractual

\$ 963.958.963

Valor por km proyectado

Variación total (valor adicional)

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Salgar – La Cámara – La Quiebra

LOTE 5 · Longitud: 15.930 m
Tránsito – Estructuración: 169.000
Tránsito – Diseño: 124.932 / 541.266

Teórica

TSD

BGTC

Subbase 18 cm

Subrasante estabilizada con cal

28 cm

20 cm

Espesor total: 48 cm

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)	% de variación
Construcción de alcantarillas	\$ 2.589.421.366	16,9 %				
Construcción de cunetas	\$ 2.415.026.789	15,7 %				
Construcción de filtros para cunetas	\$ 2.543.361.498	16,6 %				
Construcción de bordillos	\$ 362.917.244	2,4 %				
Construcción de disipadores	\$ 398.742.286	2,6 %				
Estabilización con material granular	\$ 6.828.134.354	44,5 %				
Señalización vial	\$ 218.262.750	1,4 %				
Alternativas constructivas	\$ –	0,0 %				
TOTAL CORREDOR	\$ 15.355.866.287	100%				

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Salgar – La Cámara – La Quiebra

Longitud
15,93 km
Alcance real 11,42 km · dif. 4,51 km

Valor total del corredor
\$ 15.355.866.287
\$ 963.958.963 por km


Avance físico
Sin dato
Pendiente de reporte

Avance financiero
Sin dato
Pendiente de reporte

Plazo transcurrido
65,5 %
7,9 de 12 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **05/02/2026**
Terminación: **05/02/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABSCISA

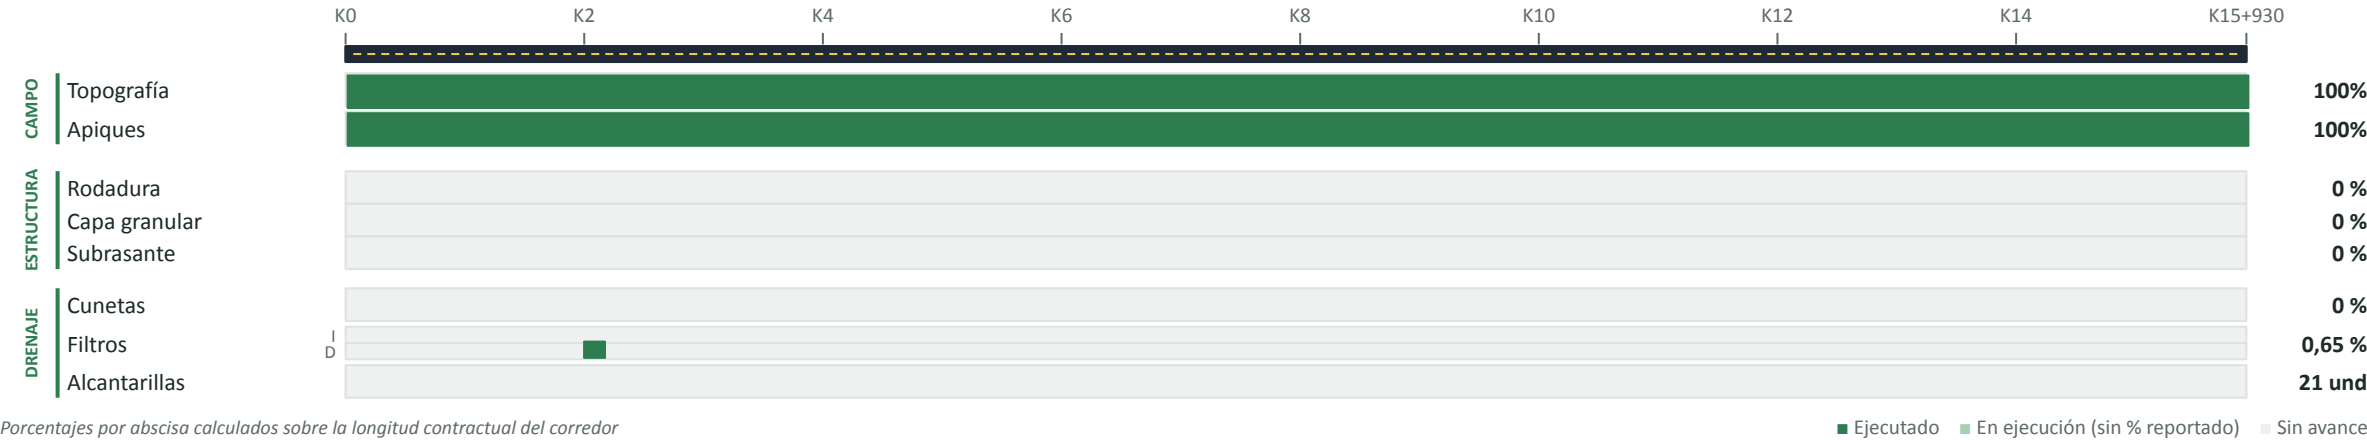

AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad	Unidad	Presupuestada	Ejec. anterior	Ejec. actual	Δ semana
Topografía	km	15,93	15,93	15,93	0
Apiques	und	64	64	64	0
Construcción alcantarillas	und	77	21	21	0
Construcción cunetas	m	15.930	0	0	0
Construcción filtros	m	15.930	104	230	+126
Construcción bordillos	m	3.186	0	0	0
Estabilización	m²	79.650	0	0	0
Señalización vial	m	47.790	0	0	0

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Valparaíso – Támesis

Longitud contractual

22,51 km

Longitud probable a cubrir

14,90 km

Valor por km contractual

\$ 995.584.782

Valor por km proyectado

\$ 1.503.618.973

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 11.435.849.630

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Valparaíso – Támesis

LOTE 5 · Longitud: 22.510 m
Tránsito – Estructuración: 307.000
Tránsito – Diseño: 330.248

Teórica

TSD

BGTC

Subbase 18 cm

Subrasante estabilizada con cal

28 cm

20 cm

Espesor total: 48 cm

Aprobada

TSD

BGTC

Subbase

30 cm

12 cm

Espesor total: 42 cm

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)		% de variación
Construcción de alcantarillas	\$ 4.607.828.254	20,6 %	\$ 13.347.131.177	39,4 %	▲	\$ 8.739.302.923	189,7 %
Construcción de cunetas	\$ 3.380.741.187	15,1 %	\$ 2.661.919.163	7,9 %	▼	–\$ 718.822.024	-21,3 %
Construcción de filtros para cunetas	\$ 3.486.471.885	15,6 %	\$ 3.523.073.415	10,4 %	▲	\$ 36.601.530	1,0 %
Construcción de bordillos	\$ 512.753.800	2,3 %	\$ 501.816.460	1,5 %	▼	–\$ 10.937.340	-2,1 %
Construcción de disipadores	\$ 649.126.552	2,9 %	\$ 602.451.168	1,8 %	▼	–\$ 46.675.384	-7,2 %
Estabilización con material granular	\$ 9.463.687.575	42,2 %	\$ 12.133.927.965	35,8 %	▲	\$ 2.670.240.390	28,2 %
Señalización vial	\$ 310.004.190	1,4 %	\$ 310.004.190	0,9 %		\$ 0	0,0 %
Alternativas constructivas	\$ –	0,0 %	\$ 766.139.535	2,3 %	▲	\$ 766.139.535	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 22.410.613.443	100%	\$ 33.846.463.073	100%	▲	+\$ 11.435.849.630	51,0 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Valparaíso – Támesis

Longitud
22,51 km
Alcance real 14,90 km · dif. 7,61 km

Valor total del corredor
\$ 22.410.613.443
\$ 995.584.782 por km


Avance físico
Sin dato
Pendiente de reporte

Avance financiero
Sin dato
Pendiente de reporte

Plazo transcurrido
65,5 %
7,9 de 12 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **05/02/2026**
Terminación: **05/02/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

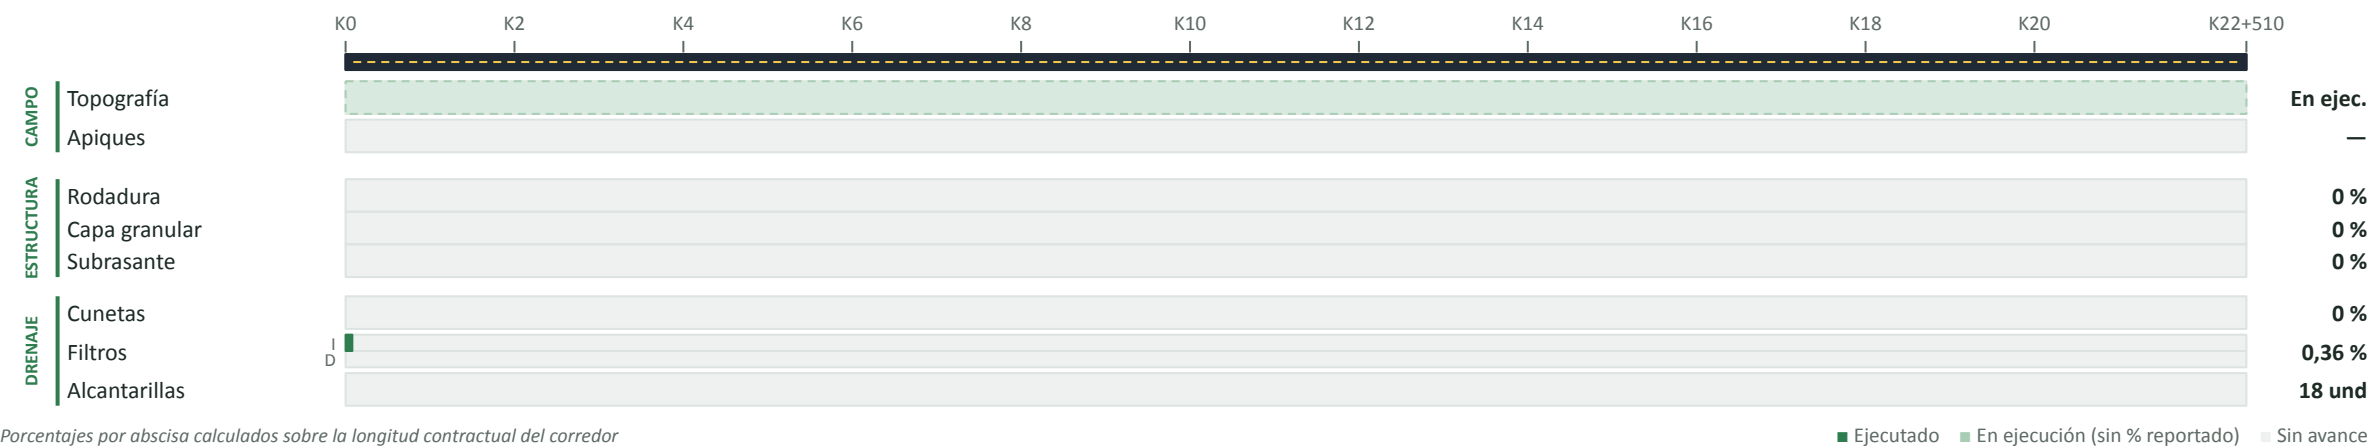

AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad	Unidad	Presupuestada	Ejec. anterior	Ejec. actual	Δ semana
Topografía	km	22,51	22,51	22,51	0
Apiques	und	90	90	90	0
Construcción alcantarillas	und	136	18	18	0
Construcción cunetas	m	22.510	0	0	0
Construcción filtros	m	22.510	80	128	+48
Construcción bordillos	m	4.502	0	0	0
Estabilización	m²	112.550	0	0	0
Señalización vial	m	67.530	0	0	0



Pueblorrico – San José – Ye a la Bodega – La Bodega (Andes)

Longitud contractual

22,39 km

Longitud probable a cubrir

13,28 km

Valor por km contractual


\$ 961.284.147

Valor por km proyectado

\$ 1.620.539.416

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 14.760.725.480

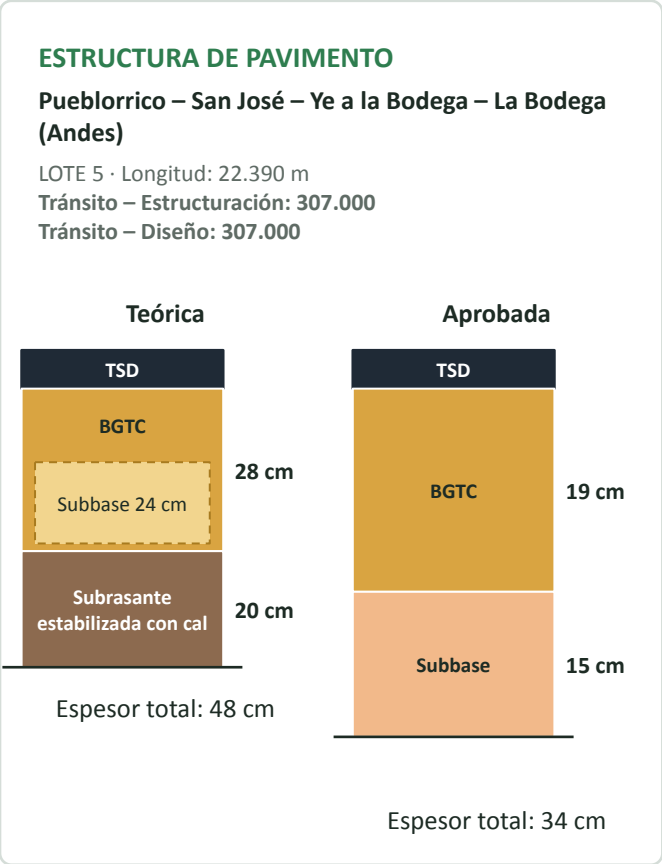

Pueblorrico – San José – Ye a la Bodega – La Bodega (Andes)

Longitud
22,39 km

Valor total del corredor
\$ 21.523.152.051
\$ 961.284.147 por km


Avance físico
13,56 %
Frente a 69,8 % del plazo

Avance financiero
17,16 %


Plazo transcurrido
69,8 %
7,7 de 11 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **11/02/2026**
Terminación: **11/01/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

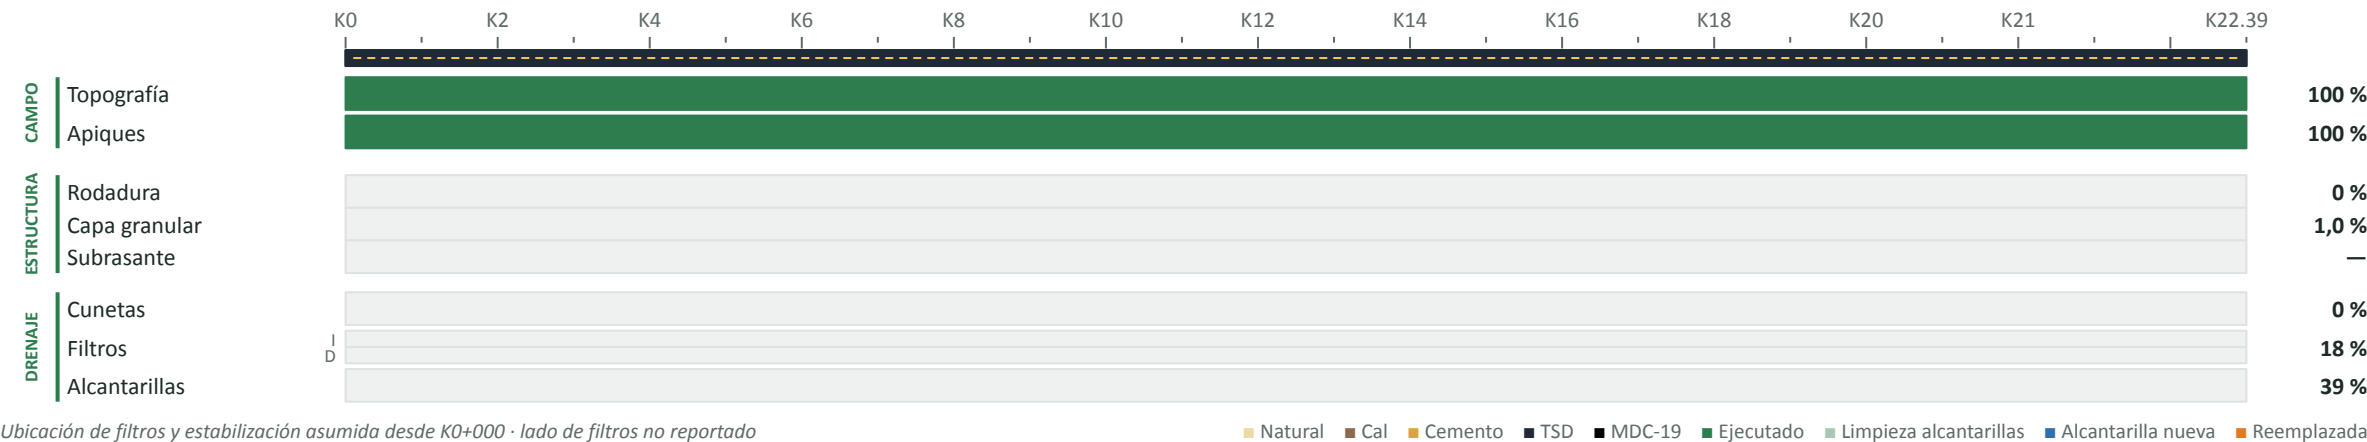

AVANCE POR ACTIVIDAD

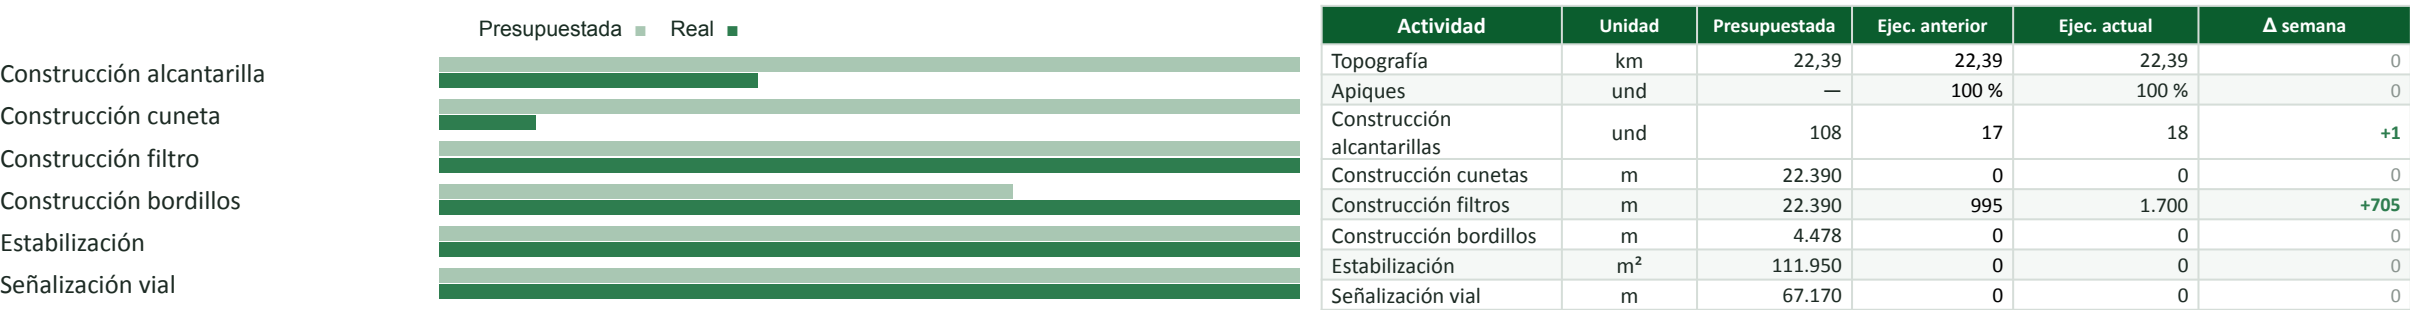

Consolidado Lote 5 – Suroeste

Km contratados

68,26 km

5 corredores

Km que se alcanzan

44,93 km

Cobertura 65,5 % del valor proyectado

Valor contractual

\$ 67.298.289.512

\$ 985.911.068 por km

Valor proyectado

\$ 102.735.112.590

\$ 1.505.055.854 por km

Adición estimada

▲ \$ 35.436.823.078

+52,7 % sobre lo contractual

Corredor	Longitud (km)	Valor contractual	\$/km contractual	Valor proyectado	\$/km proyectado	Longitud probable (km)	Variación (valor adicional)	% variación	Cobertura
Salgar – La Cámara – La Quiebra	15,93	\$ 15.355.866.287	\$ 963.958.963	\$ 21.422.206.991	\$ 1.344.771.311	11,42	▲ \$ 6.066.340.704	39,5 %	71,7 %
Valparaíso – Támesis	22,51	\$ 22.410.613.443	\$ 995.584.782	\$ 33.846.463.073	\$ 1.503.618.973	14,90	▲ \$ 11.435.849.630	51,0 %	66,2 %
Pueblorrico – San José – Ye a la Bodega – La Bodega (Andes)	22,39	\$ 21.523.152.051	\$ 961.284.147	\$ 36.283.877.531	\$ 1.620.539.416	13,28	▲ \$ 14.760.725.480	68,6 %	59,3 %
SUBTOTAL CORREDORES CON PROYECCIÓN	60,83	\$ 59.289.631.781	\$ 974.677.491	\$ 91.552.547.595	\$ 1.505.055.854	39,60	▲ \$ 32.262.915.814	54,4 %	64,8 %
Abejorral – El Cairo – La Elvira (Cruce Ruta 25) *	2,43	\$ 2.404.113.312	\$ 989.347.042	\$ 3.657.285.725	\$ 1.505.055.854	1,60	▲ \$ 1.253.172.413	52,1 %	65,7 %
Titiribí – Armenia *	5,00	\$ 5.604.544.419	\$ 1.120.908.884	\$ 7.525.279.270	\$ 1.505.055.854	3,72	▲ \$ 1.920.734.851	34,3 %	74,5 %
TOTAL LOTE	68,26	\$ 67.298.289.512	\$ 985.911.068	\$ 102.735.112.590	\$ 1.505.055.854	44,93	▲ \$ 35.436.823.078	52,7 %	65,5 %

* Valor contractual según presupuesto del oferente; valor proyectado estimado con el promedio del valor por km proyectado de los corredores con proyección del lote (\$ 1.505.055.854).

Valor total del contrato \$ 72.870 M · Valor contractual de obra \$ 67.298.289.512. Proyecciones de Salgar, Valparaíso y Pueblorrico con corte a 28/09/2026.

Longitud probable = longitud × valor contractual ÷ valor proyectado · Cobertura = valor contractual ÷ valor proyectado.

KILÓMETROS DEL LOTE QUE SE CUBREN CON EL VALOR CONTRACTUAL



Caramanta – Cristales – San Roque

Longitud contractual

20,64 km

Longitud probable a cubrir

11,81 km

Valor por km contractual


\$ 973.319.294

Valor por km proyectado

\$ 1.700.673.072

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 15.012.581.974

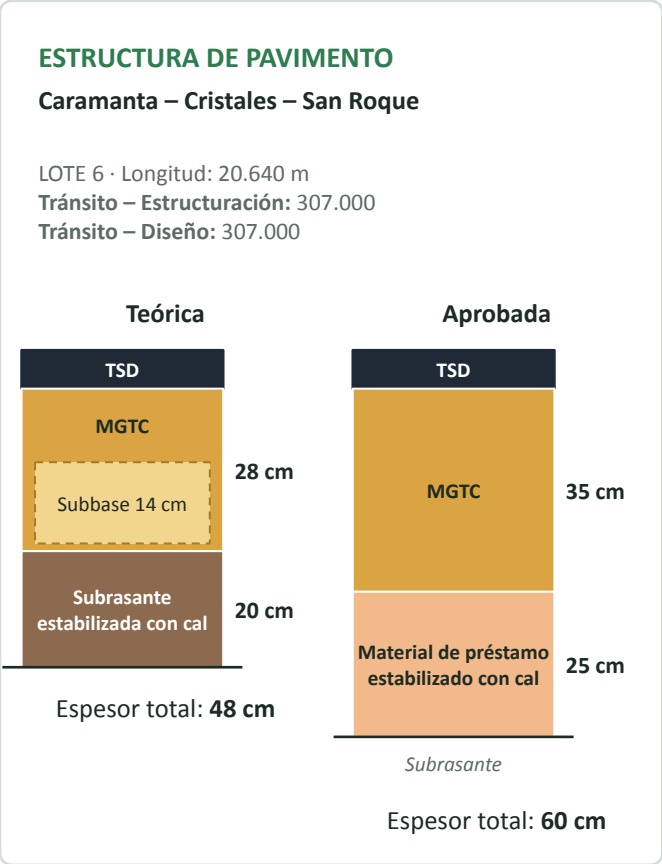

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)	% de variación
Construcción de alcantarillas	\$ 2.822.725.301	14,05%	\$ 1.618.590.308	4,61%	▼ –\$ 1.204.134.993	–42,7 %
Construcción de cunetas	\$ 3.108.608.497	15,47%	\$ 4.352.051.896	12,40%	▲ \$ 1.243.443.399	40,0 %
Construcción de filtros para cunetas	\$ 3.542.760.561	17,64%	\$ 5.062.940.625	14,42%	▲ \$ 1.520.180.064	42,9 %
Construcción de bordillos	\$ 461.834.987	2,30%	\$ 461.834.987	1,32%	\$ 0	0,0 %
Construcción de disipadores	\$ 389.847.898	1,94%	\$ 389.847.898	1,11%	\$ 0	0,0 %
Estabilización con material granular	\$ 9.483.261.960	47,21%	\$ 13.977.986.206	39,82%	▲ \$ 4.494.724.246	47,4 %
Señalización	\$ 280.271.025	1,40%	\$ 280.271.025	0,80%	\$ 0	0,0 %
Actividades no previstas			\$ 8.958.369.258	25,52%	▲ \$ 8.958.369.258	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 20.089.310.229	100%	\$ 35.101.892.203	100%	▲ +\$ 15.012.581.974	74,7 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Caramanta – Cristales – San Roque

Longitud
20,64 km
Alcance real 11,81 km · dif. 8,83 km

Valor total del corredor
\$ 20.089.310.229
\$ 973.319.294 por km


Avance físico
1,79 %
Frente a 59,5 % del plazo

Avance financiero
0,00 %

Plazo transcurrido
59,5 %
7,7 de 13 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **10/02/2026**
Terminación: **10/03/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

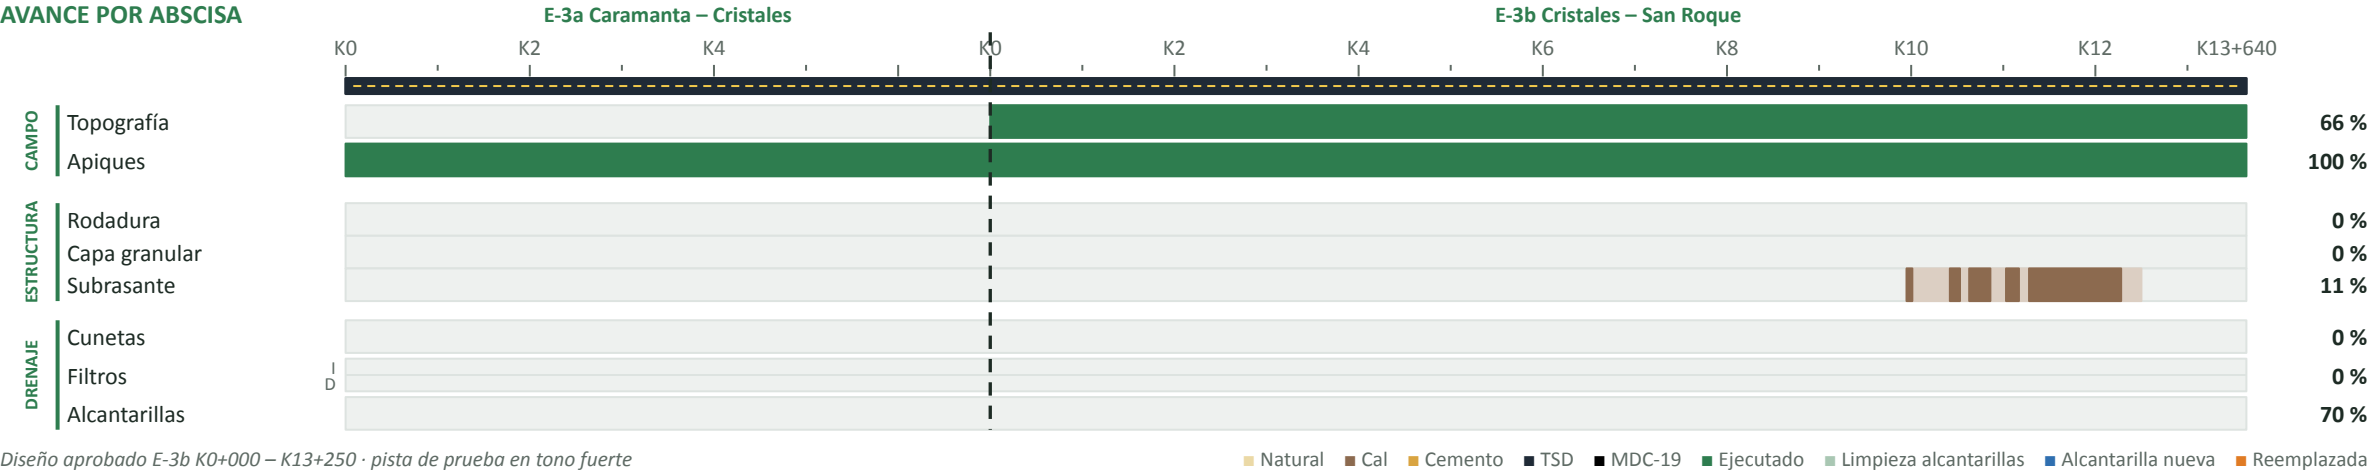

San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría

Longitud contractual

23,46 km

Longitud probable a cubrir

13,13 km

Valor por km contractual

\$ 971.877.255

Valor por km proyectado

\$ 1.736.669.427


Variación total (valor adicional)

▲ \$ 17.942.024.364

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría

LOTE 6 · Longitud: 23.460 m
Tránsito – Estructuración: 307.000
Tránsito – Diseño: 307.000

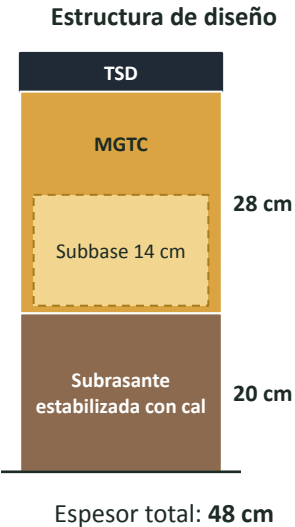

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)	% de variación
Construcción de alcantarillas	\$ 3.704.450.385	16,25%	\$ 2.021.955.085	4,96%	▼ –\$ 1.682.495.300	–45,4 %
Construcción de cunetas	\$ 3.494.178.091	15,33%	\$ 4.891.849.327	12,01%	▲ \$ 1.397.671.236	40,0 %
Construcción de filtros para cunetas	\$ 3.890.778.778	17,06%	\$ 5.649.503.169	13,87%	▲ \$ 1.758.724.391	45,2 %
Construcción de bordillos	\$ 524.895.349	2,30%	\$ 524.895.349	1,29%	\$ 0	0,0 %
Construcción de disipadores	\$ 543.504.208	2,38%	\$ 543.504.208	1,33%	\$ 0	0,0 %
Estabilización con material granular	\$ 10.327.350.953	45,29%	\$ 18.970.436.212	46,56%	▲ \$ 8.643.085.259	83,7 %
Señalización	\$ 315.082.635	1,38%	\$ 315.082.635	0,77%	\$ 0	0,0 %
Actividades no previstas			\$ 7.825.038.778	19,21%	▲ \$ 7.825.038.778	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 22.800.240.399	100%	\$ 40.742.264.763	100%	▲ +\$ 17.942.024.364	78,7 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría

Longitud
23,46 km
Alcance real 13,13 km · dif. 10,33 km

Valor total del corredor
\$ 22.800.240.339
\$ 971.877.252 por km


Avance físico
0,32 %
Frente a 59,5 % del plazo

Avance financiero
0,00 %

Plazo transcurrido
59,5 %
7,7 de 13 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **10/02/2026**
Terminación: **10/03/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

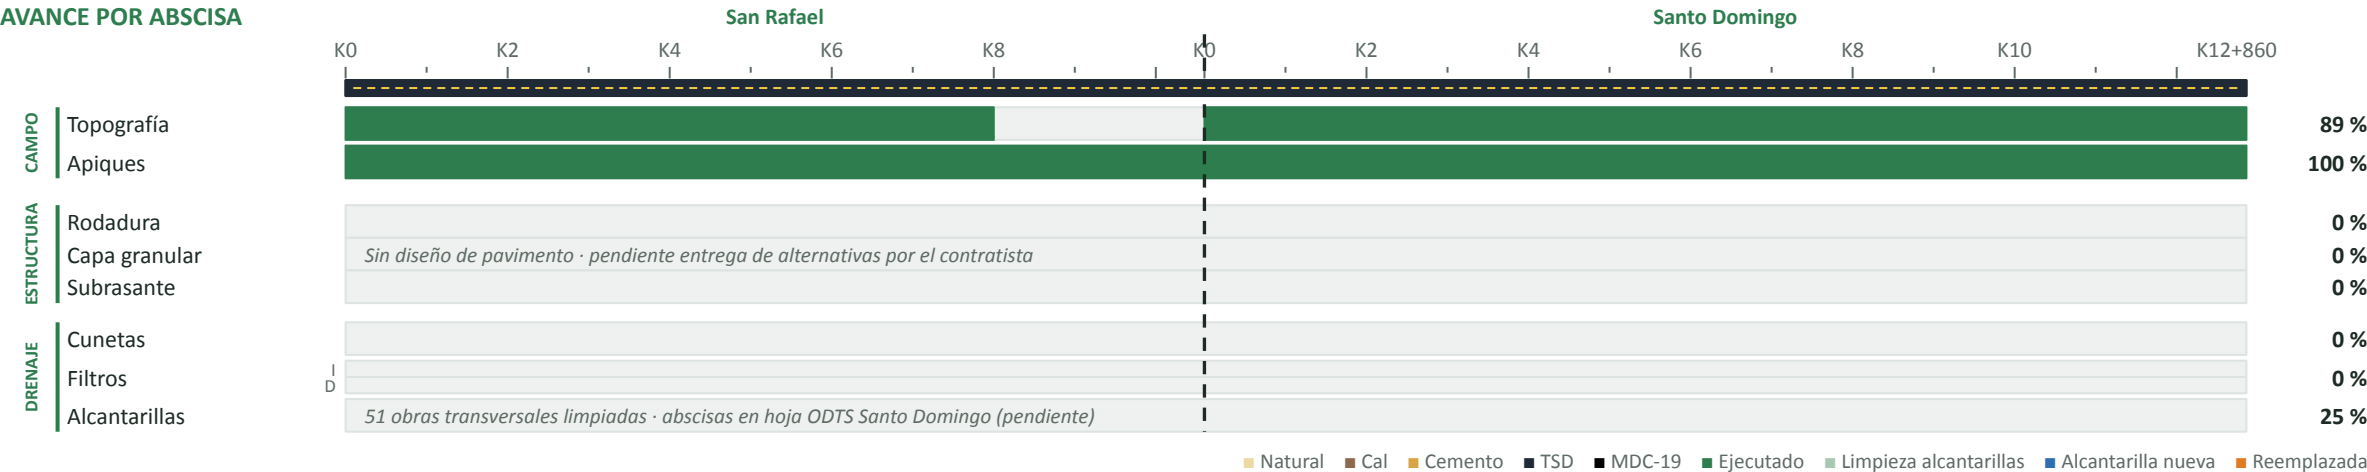

AVANCE POR ACTIVIDAD

Topografía	89 %	Unidad	Presupuestada	Ejec. anterior	Ejec. actual	Δ semana
Apiques	100 %	km	23,46	20,86	s.r.	—
Limpieza obras transversales	25 %	und	98	s.r.	98	—
Reposición de alcantarillas	0 %	und	205	49	s.r.	—
Nuevas alcantarillas	0 %	und	111	0	s.r.	—
Filtros	0 %	und	111	0	s.r.	—
Cunetas	0 %	m	23.460	0	s.r.	—
Bordillos	0 %	m	23.460	0	s.r.	—
Conformación y adecuación	0 %	m	4.692	0	s.r.	—
Estabilización material existente	N/A	km	23,46	0	s.r.	—
Estabilización material de préstamo	0 %	km	N/A	0	s.r.	—
Señalización	0 %	km	23,46	0	s.r.	—
		ml	70.380	0	s.r.	—

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Inicio: 10/02/2026 · Terminación: 10/03/2027 · Al: 02/10/2026 · 234 de 393 días



Amalfi – Portachuelos – Santa Isabel

Longitud contractual

10,00 km

Longitud probable a cubrir

5,80 km

Valor por km contractual

\$ 957.989.619

Valor por km proyectado

\$ 1.651.644.363


Variación total (valor adicional)

▲ \$ 6.936.547.436

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Amalfi – Portachuelos – Santa Isabel

LOTE 6 · Longitud: 10.000 m
Tránsito – Estructuración: 307.000
Tránsito – Diseño: 307.000

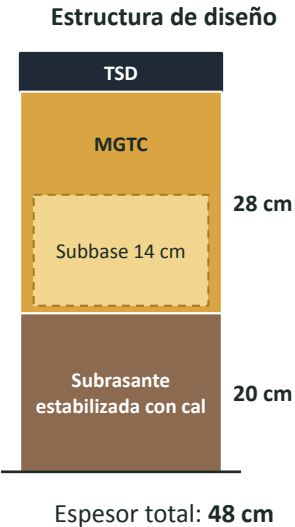

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)	% de variación
Construcción de alcantarillas	\$ 1.687.286.096	17,61%	\$ 906.099.614	5,49%	▼ -\$ 781.186.482	-46,3 %
Construcción de cunetas	\$ 1.588.129.838	16,58%	\$ 2.223.381.773	13,46%	▲ \$ 635.251.935	40,0 %
Construcción de filtros para cunetas	\$ 2.000.142.400	20,88%	\$ 2.843.339.360	17,22%	▲ \$ 843.196.960	42,2 %
Construcción de bordillos	\$ 223.740.920	2,34%	\$ 223.740.920	1,35%	\$ 0	0,0 %
Construcción de disipadores	\$ 267.998.344	2,80%	\$ 267.998.344	1,62%	\$ 0	0,0 %
Estabilización con material granular	\$ 3.677.506.945	38,39%	\$ 6.581.310.818	39,85%	▲ \$ 2.903.803.873	79,0 %
Señalización	\$ 135.091.650	1,41%	\$ 135.091.650	0,82%	\$ 0	0,0 %
Actividades no previstas			\$ 3.335.481.150	20,19%	▲ \$ 3.335.481.150	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 9.579.896.193	100%	\$ 16.516.443.629	100%	▲ +\$ 6.936.547.436	72,4 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Amalfi – Portachuelos – Santa Isabel

Longitud
10,00 km
Alcance real 5,80 km · dif. 4,20 km

Valor total del corredor
\$ 9.579.896.193
\$ 957.989.619 por km

Avance físico
0,28 %
Frente a 59,5 % del plazo

Avance financiero
0,00 %

Plazo transcurrido
59,5 %
7,7 de 13 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **10/02/2026**
Terminación: **10/03/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA



AVANCE POR ACTIVIDAD

		Unidad	Presupuestada	Ejec. anterior	Ejec. actual	Δ semana
Topografía	60 %	km	10	6	s.r.	—
Apiques	100 %	und	41	s.r.	41	—
Limpieza obras transversales	23 %	und	101	23	s.r.	—
Reposición de alcantarillas	0 %	und	50	0	s.r.	—
Nuevas alcantarillas	0 %	und	50	0	s.r.	—
Filtros	0 %	m	10.000	0	s.r.	—
Cunetas	0 %	m	10.000	0	s.r.	—
Bordillos	0 %	m	2.000	0	s.r.	—
Conformación y adecuación	0 %	km	10	0	s.r.	—
Estabilización material existente	N/A	km	N/A	0	s.r.	—
Estabilización material de préstamo	0 %	km	10	0	s.r.	—
Señalización	0 %	ml	30.000	0	s.r.	—

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Consolidado Lote 6 – Nordeste

Km contratados

54,10 km

3 corredores

Km que se alcanzan

30,74 km

Cobertura 56,8 % del valor proyectado

Valor contractual

\$ 52.469.446.821

\$ 969.860.385 por km

Valor proyectado

\$ 92.360.600.594

\$ 1.707.219.974 por km

Adición estimada

▲ \$ 39.891.153.773

+76,0 % sobre lo contractual

Corredor	Longitud (km)	Valor contractual	\$/km contractual	Valor proyectado	\$/km proyectado	Longitud probable (km)	Variación (valor adicional)	% variación	Cobertura
Caramanta – Cristales – San Roque	20,64	\$ 20.089.310.229	\$ 973.319.294	\$ 35.101.892.203	\$ 1.700.673.072	11,81	▲ \$ 15.012.581.974	74,7 %	57,2 %
San Rafael – San Roque – Santo Domingo – Alejandría	23,46	\$ 22.800.240.399	\$ 971.877.255	\$ 40.742.264.763	\$ 1.736.669.427	13,13	▲ \$ 17.942.024.364	78,7 %	56,0 %
Amalfi – Portachuelos – Santa Isabel	10,00	\$ 9.579.896.193	\$ 957.989.619	\$ 16.516.443.629	\$ 1.651.644.363	5,80	▲ \$ 6.936.547.436	72,4 %	58,0 %
TOTAL LOTE	54,10	\$ 52.469.446.821	\$ 969.860.385	\$ 92.360.600.594	\$ 1.707.219.974	30,74	▲ \$ 39.891.153.773	76,0 %	56,8 %

Valor total del contrato \$ 57.385.592.096 · Valor contractual de obra \$ 52.469.446.821 · Valores reembolsables \$ 4.916.145.275.

Longitud probable = longitud × valor contractual ÷ valor proyectado · Cobertura = valor contractual ÷ valor proyectado.

KILÓMETROS DEL LOTE QUE SE CUBREN CON EL VALOR CONTRACTUAL



Cáceres – El Tigre – Alto de Tamaná – La Chilona

Longitud contractual

25,00 km

Longitud probable a cubrir

17,87 km

Valor por km contractual

\$ 975.541.902

Valor por km proyectado

\$ 1.365.056.266

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 9.737.859.093

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Cáceres – El Tigre – Alto de Tamaná – La Chilona

LOTE 7 · Longitud: 25.000 m
Tránsito – Estructuración: Sin reporte
Tránsito – Diseño: 208.703

Teórica

TSD

Estabilización con cemento

Subbase 13 cm

Subrasante estabilizada con cal

27 cm

20 cm

Espesor total: 47 cm

Presupuesto

TSD

Estabilización con cemento (MGTC)

Afirmado

28 cm

8 cm

Subrasante

Espesor total: 36 cm

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)	% de variación
Construcción de alcantarillas	\$ 5.453.527.858	22,36%	\$ 4.500.352.779	13,19%	▼ -\$ 953.175.079	-17,5 %
Construcción de cuneta	\$ 3.669.853.600	15,05%	\$ 4.486.468.168	13,15%	▲ \$ 816.614.568	22,3 %
Construcción de filtro para cunetas	\$ 3.902.920.000	16,00%	\$ 4.556.150.200	13,35%	▲ \$ 653.230.200	16,7 %
Construcción de bordillos	\$ 303.862.400	1,25%	\$ 453.181.500	1,33%	▲ \$ 149.319.100	49,1 %
Construcción de disipadores	\$ 790.756.800	3,24%	\$ 395.395.799	1,16%	▼ -\$ 395.361.001	-50,0 %
Estabilización con material granular	\$ 9.900.763.894	40,60%	\$ 19.367.995.199	56,75%	▲ \$ 9.467.231.305	95,6 %
Señalización vial	\$ 366.863.000	1,50%	\$ 366.863.000	1,08%	\$ 0	0,0 %
TOTAL CORREDOR	\$ 24.388.547.552	100%	\$ 34.126.406.645	100%	▲ +\$ 9.737.859.093	39,9 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Totales sin provisión para ajustes y obras complementarias (\$ 1.973.523.417). Con el valor contractual (\$ 26.362.070.969) se alcanzan 17,31 km (alcance actualizado).

Notas:

Cáceres – El Tigre – Alto de Tamaná – La Chilona

Longitud
25,00 km
Alcance real 17,87 km · dif. 7,13 km

Valor total del corredor
\$ 26.362.070.969
\$ 1.054.482.839 por km


Avance físico
13,56 %
Frente a 69,8 % del plazo

Avance financiero
17,16 %


Plazo transcurrido
69,8 %
7,7 de 11 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **11/02/2026**
Terminación: **11/01/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

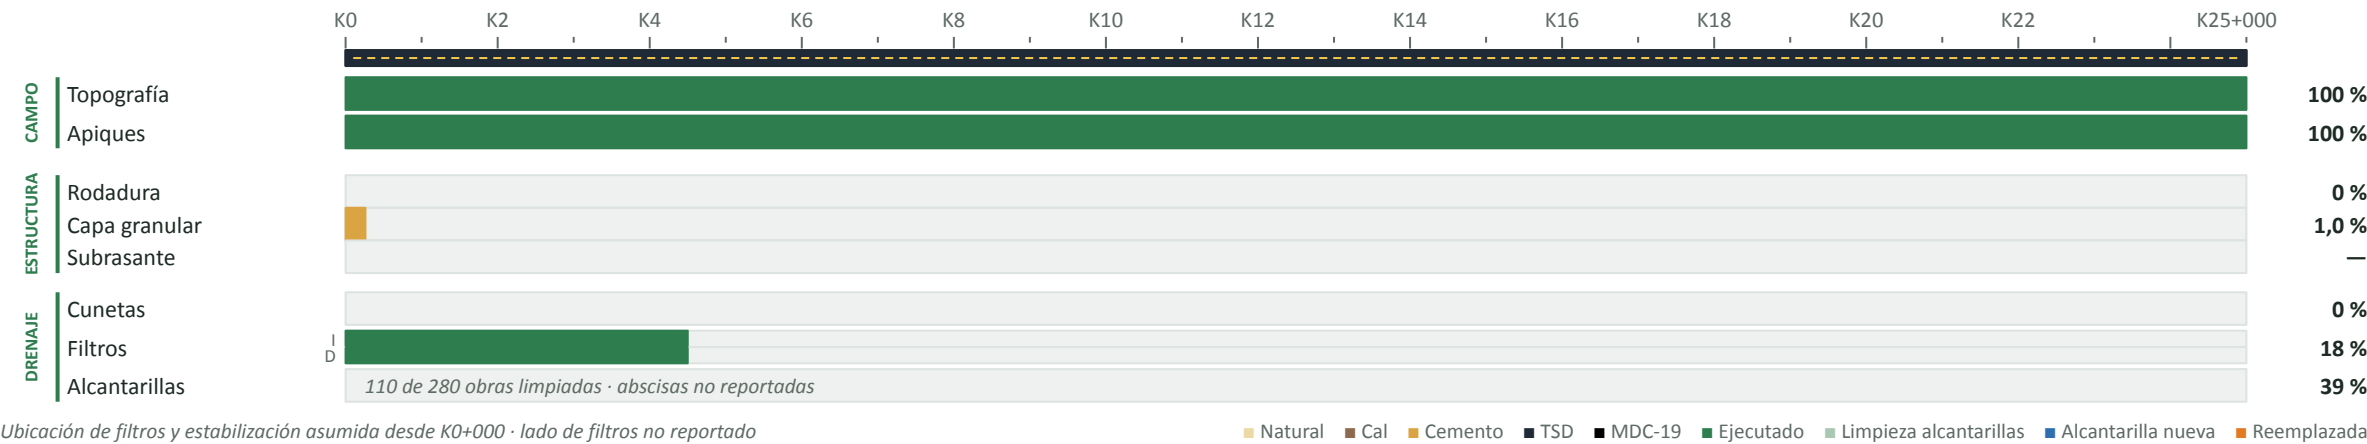

AVANCE POR ACTIVIDAD

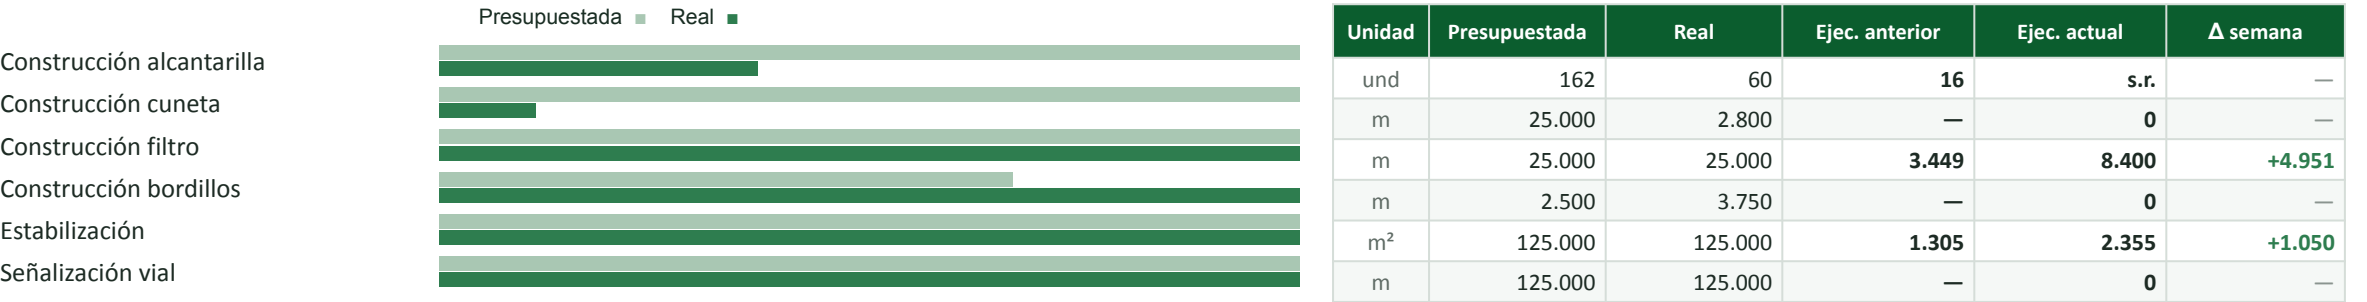

Consolidado Lote 7 – Bajo Cauca

Km contratados

25,00 km

1 corredores

Km que se alcanzan

17,87 km

Cobertura 71,5 % del valor proyectado

Valor contractual

\$ 24.388.547.552

\$ 975.541.902 por km

Valor proyectado

\$ 34.126.406.645

\$ 1.365.056.266 por km

Adición estimada

▲ \$ 9.737.859.093

+39,9 % sobre lo contractual

Corredor	Longitud (km)	Valor contractual	\$/km contractual	Valor proyectado	\$/km proyectado	Longitud probable (km)	Variación (valor adicional)	% variación	Cobertura
Cáceres – El Tigre – Alto de Tamaná – La Chilona	25,00	\$ 24.388.547.552	\$ 975.541.902	\$ 34.126.406.645	\$ 1.365.056.266	17,87	▲ \$ 9.737.859.093	39,9 %	71,5 %
TOTAL LOTE	25,00	\$ 24.388.547.552	\$ 975.541.902	\$ 34.126.406.645	\$ 1.365.056.266	17,87	▲ \$ 9.737.859.093	39,9 %	71,5 %

Valor total del contrato \$ 28.335.594.386 · Valor contractual de obra \$ 24.388.547.552 · Valores reembolsables \$ 3.947.046.834. Los valores reembolsables incluyen la provisión para ajustes y obras complementarias (\$ 1.973.523.417).

Longitud probable = longitud × valor contractual ÷ valor proyectado · Cobertura = valor contractual ÷ valor proyectado.

KILÓMETROS DEL LOTE QUE SE CUBREN CON EL VALOR CONTRACTUAL



Santa Rosa – Carolina del Príncipe

Longitud contractual

33,67 km

Longitud probable a cubrir

23,82 km

Valor por km contractual


\$ 968.457.522

Valor por km proyectado

\$ 1.368.845.877

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 13.481.075.911

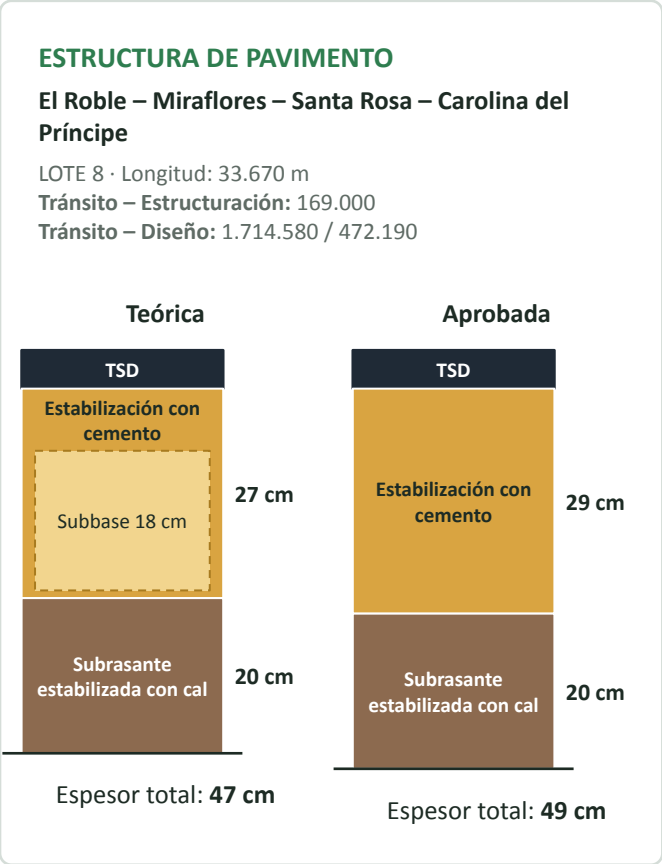

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)		% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 3.859.488.185	12%	\$ 8.296.138.597	18%	▲	\$ 4.436.650.412	115,0 %
Construcción cuneta	\$ 5.024.244.765	15%	\$ 5.155.470.583	11%	▲	\$ 131.225.818	2,6 %
Construcción filtro	\$ 5.502.221.299	17%	\$ 5.432.048.440	12%	▼	–\$ 70.172.859	–1,3 %
Construcción bordillos	\$ 760.761.231	2%	\$ 3.749.960.897	8%	▲	\$ 2.989.199.666	392,9 %
Construcción disipadores	\$ 562.034.567	2%	\$ 562.034.567	1%		\$ 0	0,0 %
Estabilización	\$ 16.438.675.974	50%	\$ 22.008.404.828	48%	▲	\$ 5.569.728.854	33,9 %
Señalización vial	\$ 460.538.730	1%	\$ 460.538.730	1%		\$ 0	0,0 %
Obra extra	\$ –		\$ 424.444.020	1%	▲	\$ 424.444.020	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 32.607.964.751	100%	\$ 46.089.040.662	100%	▲	+\$ 13.481.075.911	41,3 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Santa Rosa – Carolina del Príncipe

Longitud

33,67 km

Alcance real 23,82 km · dif. 9,85 km

Valor total del corredor

\$ 32.607.964.751

\$ 968.457.522 por km

Avance físico

13,18 %

Frente a 42,7 % del plazo

Avance financiero

11,25 %

Plazo transcurrido

42,7 %


7,7 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: 11/02/2026

Terminación: 11/08/2027

Corte: 25/09/2026

AVANCE POR ABCISA

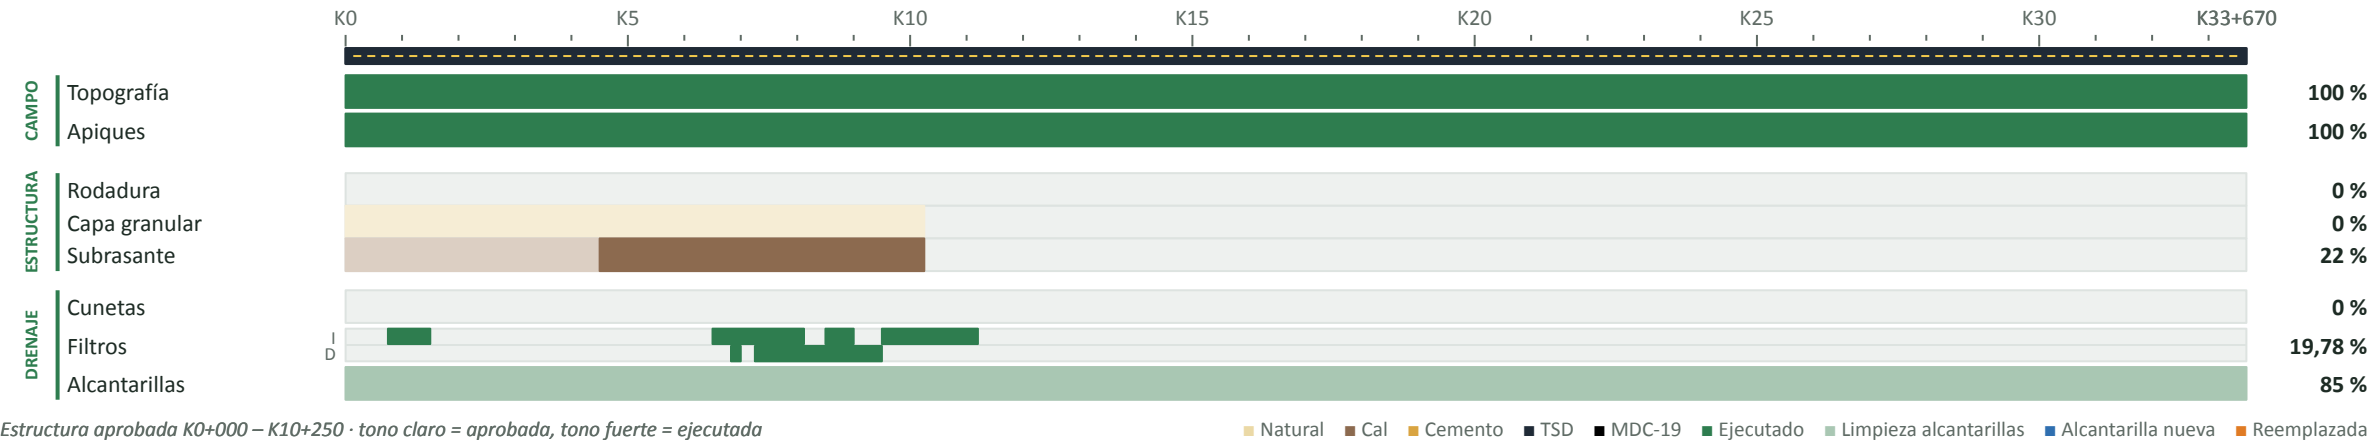

Entrerríos – San José de la Montaña

Longitud contractual

39,95 km

Longitud probable a cubrir

25,76 km

Valor por km contractual

\$ 908.173.208

Valor por km proyectado

\$ 1.408.526.148

Variación total (valor adicional)

▲ \$ 19.989.099.933

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Entrerríos – Labores – San José de la Montaña

LOTE 8 · Longitud: 39.950 m
Tránsito – Estructuración: 307.000
Tránsito – Diseño: 1.610.092 / 354.178

Teórica

TSD

Estabilización con cemento

Subbase 19 cm

Subrasante estabilizada con cal

28 cm

20 cm

Espesor total: 48 cm

Aprobada

TSD

Estabilización con cemento

Subrasante estabilizada con cal

23 cm

20 cm

Espesor total: 43 cm

Grupo – actividad	Valor contractual	% sobre corredor	Valor proyectado	% sobre corredor	Variación (valor adicional)		% de variación
Construcción alcantarilla	\$ 3.512.550.967	10%	\$ 11.308.233.615	20%	▲	\$ 7.795.682.648	221,9 %
Construcción cuneta	\$ 5.872.558.871	16%	\$ 6.715.635.227	12%	▲	\$ 843.076.356	14,4 %
Construcción filtro	\$ 6.221.288.057	17%	\$ 6.434.653.376	11%	▲	\$ 213.365.319	3,4 %
Construcción bordillos	\$ 902.611.005	2%	\$ 4.429.943.025	8%	▲	\$ 3.527.332.020	390,8 %
Construcción disipadores	\$ 495.928.073	1%	\$ 495.928.073	1%		\$ 0	0,0 %
Estabilización	\$ 18.731.527.393	52%	\$ 24.483.202.283	44%	▲	\$ 5.751.674.890	30,7 %
Señalización vial	\$ 545.055.300	2%	\$ 417.615.000	1%	▼	-\$ 127.440.300	-23,4 %
Obra extra	\$ –		\$ 1.985.409.000	4%	▲	\$ 1.985.409.000	N/A
TOTAL CORREDOR	\$ 36.281.519.666	100%	\$ 56.270.619.599	100%	▲	+\$ 19.989.099.933	55,1 %

▲ Se requiere mayor valor ▼ Sobra valor % de variación = (valor proyectado – valor contractual) / valor contractual

Notas:

Entrerríos – Labores – San José de la Montaña

Longitud
39,95 km
Alcance real 25,70 km · dif. 14,25 km

Valor total del corredor
\$ 36.281.519.666
\$ 908.173.208 por km


Avance físico
13,01 %
Frente a 42,7 % del plazo

Avance financiero
10,80 %


Plazo transcurrido
42,7 %
7,7 de 18 meses (al 02/10/2026)

Inicio: **11/02/2026**
Terminación: **11/08/2027**
Corte: **25/09/2026**

AVANCE POR ABCISA

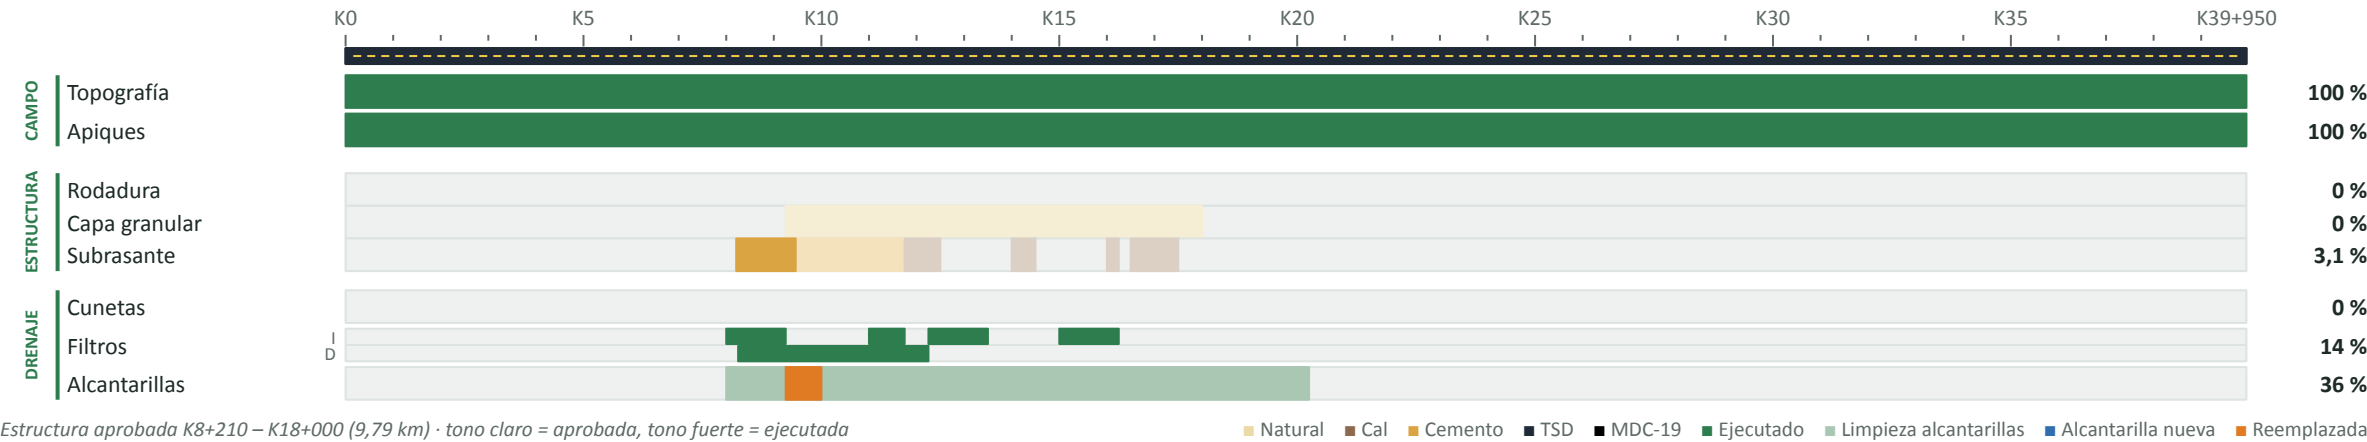

AVANCE POR ACTIVIDAD

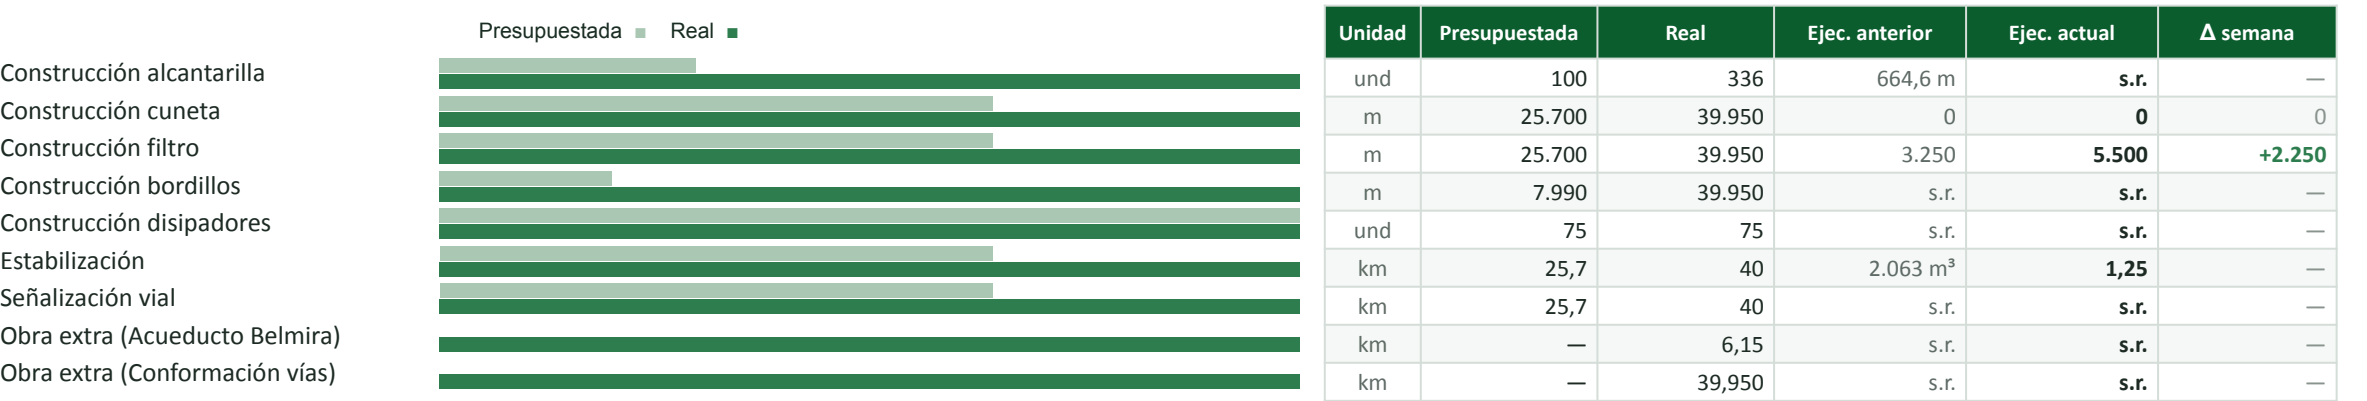

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PLAZO CONTRACTUAL



Consolidado Lote 8 – Norte

Km contratados

117,25 km

6 corredores

Km que se alcanzan

80,80 km

Cobertura 68,9 % del valor proyectado

Valor contractual

\$ 112.298.722.708

\$ 957.771.622 por km

Valor proyectado

\$ 163.021.871.307

\$ 1.390.378.433 por km

Adición estimada

▲ \$ 50.723.148.599

+45,2 % sobre lo contractual

Corredor	Longitud (km)	Valor contractual	\$/km contractual	Valor proyectado	\$/km proyectado	Longitud probable (km)	Variación (valor adicional)	% variación	Cobertura
Santa Rosa – Carolina del Príncipe	33,67	\$ 32.607.964.751	\$ 968.457.522	\$ 46.089.040.662	\$ 1.368.845.877	23,82	▲ \$ 13.481.075.911	41,3 %	70,7 %
Entrerríos – San José de la Montaña	39,95	\$ 36.281.519.666	\$ 908.173.208	\$ 56.270.619.599	\$ 1.408.526.148	25,76	▲ \$ 19.989.099.933	55,1 %	64,5 %
SUBTOTAL CORREDORES CON PROYECCIÓN	73,62	\$ 68.889.484.417	\$ 935.744.151	\$ 102.359.660.261	\$ 1.390.378.433	49,58	▲ \$ 33.470.175.844	48,6 %	67,3 %
El Guayabo – El Salto – Partidas a Guadalupe *	10,61	\$ 10.454.365.274	\$ 985.331.317	\$ 14.751.915.178	\$ 1.390.378.433	7,52	▲ \$ 4.297.549.904	41,1 %	70,9 %
Carolina del Príncipe – Angostura *	13,62	\$ 13.507.950.916	\$ 991.773.195	\$ 18.936.954.262	\$ 1.390.378.433	9,72	▲ \$ 5.429.003.346	40,2 %	71,3 %
Alto del Cardal – Toledo *	15,00	\$ 14.858.442.789	\$ 990.562.853	\$ 20.855.676.500	\$ 1.390.378.433	10,69	▲ \$ 5.997.233.711	40,4 %	71,2 %
Sopetrán – Horizontes – Belmira (tramo Norte) *	4,40	\$ 4.588.479.312	\$ 1.042.836.207	\$ 6.117.665.107	\$ 1.390.378.433	3,30	▲ \$ 1.529.185.795	33,3 %	75,0 %
TOTAL LOTE	117,25	\$ 112.298.722.708	\$ 957.771.622	\$ 163.021.871.307	\$ 1.390.378.433	80,80	▲ \$ 50.723.148.599	45,2 %	68,9 %

* Valor contractual según presupuesto del oferente; valor proyectado estimado con el promedio del valor por km proyectado de los corredores con proyección del lote (\$ 1.390.378.433).

Valor total del contrato \$ 124.487.403.196 · Valor contractual de obra \$ 112.298.722.708 · Valores reembolsables \$ 12.188.680.488.

Longitud probable = longitud × valor contractual ÷ valor proyectado · Cobertura = valor contractual ÷ valor proyectado.

KILÓMETROS DEL LOTE QUE SE CUBREN CON EL VALOR CONTRACTUAL

80,80 km · 68,9 % se alcanza

36,45 km · 31,1 % pendiente

Resumen general por lote

Valor total de los contratos

\$ 690.570.935.992

Obra \$ 628.936 M · reemb. \$ 61.635 M

Km contratados

634,43 km

8 lotes

Km que se alcanzan

409,07 km

64,5 % del alcance contractual

Km pendientes

225,36 km

35,5 % del alcance contractual

Valor requerido (adición)

▲ \$ 363.508.866.626

+57,8 % sobre el valor de obra

Lote	Km contratados	Km que se alcanzan	Km pendientes	Cobertura (km)	Valor contrato	Valor contractual de obra	Valor proyectado	\$/km proyectado	Valor requerido	% variación
Lote 1 · Oriente	99,22	53,04	46,18	53,5 %	\$ 103.221 M	\$ 95.269 M	\$ 182.804 M	\$ 1.842.406.041	▲ \$ 87.534 M	91,9 %
Lote 2 · Occidente	94,95	62,33	32,62	65,6 %	\$ 104.856 M	\$ 94.505 M	\$ 146.168 M	\$ 1.539.422.695	▲ \$ 51.663 M	54,7 %
Lote 3 · Urabá	120,65	86,59	34,06	71,8 %	\$ 144.974 M	\$ 131.135 M	\$ 184.657 M	\$ 1.530.518.677	▲ \$ 53.522 M	40,8 %
Lote 4 · Magdalena Medio	55,00	32,76	22,24	59,6 %	\$ 54.442 M	\$ 51.572 M	\$ 86.572 M	\$ 1.574.030.486	▲ \$ 35.000 M	67,9 %
Lote 5 · Suroeste *	68,26	44,93	23,33	65,8 %	\$ 72.870 M	\$ 67.298 M	\$ 102.735 M	\$ 1.505.055.854	▲ \$ 35.437 M	52,7 %
Lote 6 · Nordeste	54,10	30,74	23,36	56,8 %	\$ 57.386 M	\$ 52.469 M	\$ 92.361 M	\$ 1.707.219.974	▲ \$ 39.891 M	76,0 %
Lote 7 · Bajo Cauca	25,00	17,87	7,13	71,5 %	\$ 28.336 M	\$ 24.389 M	\$ 34.126 M	\$ 1.365.056.266	▲ \$ 9.738 M	39,9 %
Lote 8 · Norte	117,25	80,80	36,45	68,9 %	\$ 124.487 M	\$ 112.299 M	\$ 163.022 M	\$ 1.390.378.433	▲ \$ 50.723 M	45,2 %
TOTAL PROGRAMA	634,43	409,07	225,36	64,5 %	\$ 690.571 M	\$ 628.936 M	\$ 992.444 M	\$ 1.564.308.842	▲ \$ 363.509 M	57,8 %

* Oriente actualizado con los valores proyectados ajustados; para los corredores sin proyección propia se utiliza el promedio de Abejorral–Santa Bárbara–El Cairo–La Elvira y La Frontera–Mesopotamia–Abejorral, excluyendo San Vicente–El Peñol (\$ 1.958.190.541 por km). Suroeste actualizado con las proyecciones de Salgar, Valparaíso y Pueblorrico; Abejorral y Titiribí se estiman con el promedio de esos tres corredores (\$ 1.505.055.854 por km). Valores en millones de pesos (M).

409,07 km · 64,5 % se alcanza con el valor de obra

225,36 km · 35,5 % pendiente



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia
